

福山駅前広場再編事業の 想定スケジュール

2024年（令和6年）9月4日



福山市 建設局 福山駅周辺再生推進部 福山駅周辺再生推進課

●C案の場合

路線バス切回し準備
(駅前広場施設撤去)

駅前広場整備 (半分) + 地下接続工事

駅前広場整備

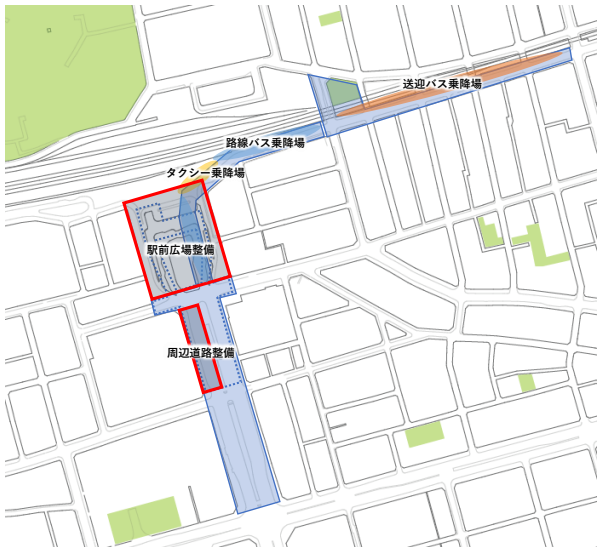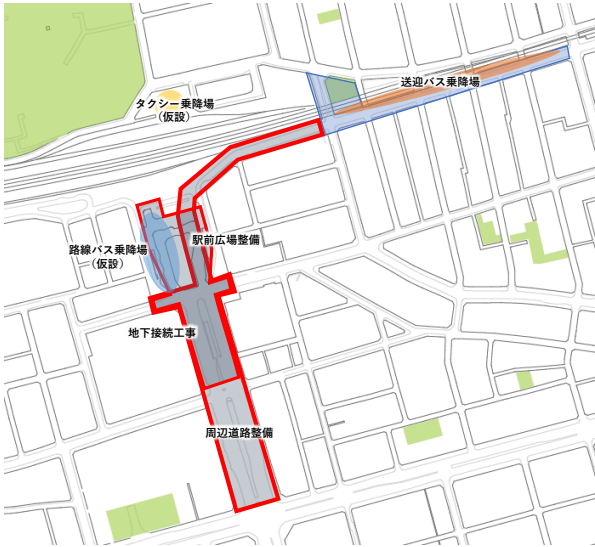

整備中
整備済

●想定期間 11年

年度	2024年度	2025年度	2026年度	2027年度	2028年度	2029年度	2030年度	2031年度	2032年度	2033年度	2034年度	2035年度
	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13	R14	R15	R16	R17
基本計画	策定											
周辺道路関係		設計	工事					工事				
地下接続関係		調査・設計		工事	埋蔵文化財調査							
駅前広場関係				施設撤去				工事		設計	工事	完成

想定切替回数		
南側	タクシー	3回
	路線バス	3回
	送迎バス	1回
	一般送迎	2回

●D案の場合

北口広場開発＋周辺道路整備



路線バス移設＋地下接続工事



駅前広場整備



●想定期間 9年

年度	2024年度	2025年度	2026年度	2027年度	2028年度	2029年度	2030年度	2031年度	2032年度	2033年度	想定切替回数		
	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13	R14	R15	南側	タクシー	1回
基本計画	策定											路線バス	1回
												送迎バス	1回
北口広場開発関係		調査・設計		工事								一般送迎	2回
周辺道路関係		設計	工事								北側	タクシー	2回
												一般送迎	2回
地下接続関係		調査・設計		工事		埋蔵文化財調査	工事						
駅前広場関係								設計	工事	完成			
(広場活用実験)				期間限定活用（5年）※									

※北口広場開発事業の期間は、1Fバスターミナル・タクシー乗降場、2F駐車場・送迎場の整備を想定している

※タクシー乗降場と待機場を優先して移設することで、現在のタクシー乗降場と待機場のスペースを暫定的に活用することを想定
