

「むろのき通信」第33号


～ 鞆町内の広島県と福山市の事業についてお知らせします～

2024（令和6）.2.21

発行：広島県東部建設事務所
 鞆地区まちづくり推進事業所 (084-921-1311)
 鞆出張所 (084-982-2701)
 福山市建設局土木部港湾河川課 (084-928-1260)

鞆未来トンネルの進捗状況について


2月6日現在の鞆未来トンネルの掘削状況は、御幸地区側からの掘削延長899m、平地区側からの掘削延長が295m、計1,194mの掘削が完了しています。

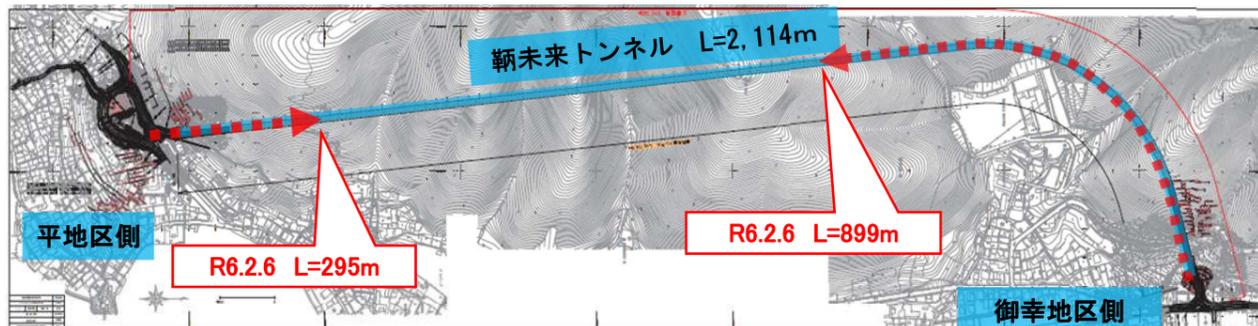

今月はトンネル内で活躍する機械についてご紹介します。これまでもトンネルを建設する機械を中心にお伝えしてきました。今回は作業の安全性や効率性を向上するために導入したターンテーブルについて、ご紹介します。トンネル内は作業幅が約10m程度と狭いため、大型の重機の方向転換（Uターン）が困難です。もし、方向転換出来ないと機械や資材が置いている狭い坑内を数百mもバックで走行することになり、大変危険です。このことから、立体駐車場などでも利用されているターンテーブルを導入しています。



西側からの掘削では、これまでに医王寺の太子殿の地下約90m付近の掘削を行いました。このことから、30m手前・直下・40m通過位の3か所について振動計測を行っています。一番大きな振動は太子殿直下の箇所です。0.47 (cm/s) を計測しましたが、家屋に対する基準値【0.5～1.0 cm/s】内（日本火薬工業会 発行）に収まっており、地表面においても異常は確認されませんでした。

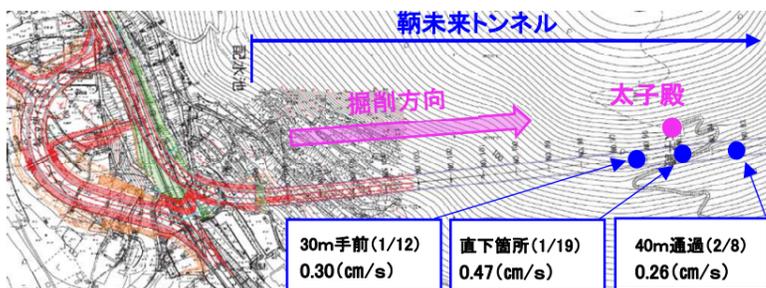


高潮対策の工事発注について

現在、鞆町内では【西町・道越地区】、【江之浦～焚場地区】、【平地区】の3箇所において高潮対策を実施しております。

このうち、【江之浦～焚場地区】、【平地区】の2箇所において、工事発注を行っています。開札は3月上旬を予定しており、施工業者が決定し次第、この紙面にてお知らせする予定です。

工事中、皆様にはご迷惑をお掛けしますが、ご理解とご協力を宜しくお願いします。

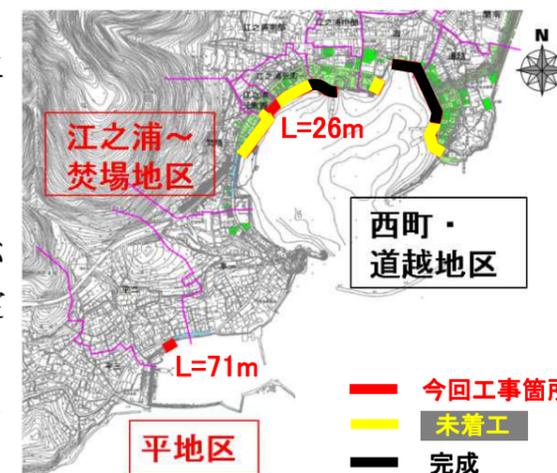

江之浦～焚場地区の道路拡幅について

江之浦～焚場地区の道路拡幅に伴う曳家（ひきや）工事を行っており、外壁や内装等を撤去し、曳家（ひきや）を実施しました。撤去時に腐食した柱や梁等が確認されたことから、補強方法の検討及びそれに伴う構造計算の再検討などで時間を要しました。このことから、曳家工事の工期末は3月から11月までに変更する予定です。これに伴う道路の拡幅工事は10月の完成見込みとなります。皆様にはご迷惑をお掛けしますが、ご理解とご協力をお願いします。



工事内容	R6.3	R6.4	R6.5	R6.6	R6.7	R6.8	R6.9	R6.10	R6.11	R6.12
足場関係仮設工事										
曳家工事										
本体工事										
電気・機械関係設備工事										
道路拡幅工事										

※「むろのき通信」は、広島県ホームページ【 <https://www.pref.hiroshima.lg.jp/soshiki/217/muronoki.html> 】, 福山市ホームページ【 <https://www.city.fukuyama.hiroshima.jp/soshiki/kowankasen/> 】にも掲載しています。



(仮称)鞆町平地区ふれあい広場整備工事(陸上施工その2)の契約について【福山市 港湾河川課】

昨年から(仮称)鞆町平地区ふれあい広場の整備工事を実施していますが、引き続き護岸の施工に必要となる仮設道を設置する「陸上施工その2」を実施します。この度、施工業者が決定しましたのでお知らせします。皆様にご迷惑とご不便をおかけしますが、ご理解・ご協力をよろしくお願いいたします。

【工事名】護岸整備工事((仮称)鞆町平地区ふれあい広場)(陸上施工その2)

【受注者】有限会社功栄工業

【工期】2023年(令和5年)12月26日～2024年(令和6年)3月29日

【問合せ先】

福山市建設局土木部港湾河川課
電話 084-928-1260



明神農道改良工事(その2)の契約について【福山市 港湾河川課】

この度、医王寺から平を繋ぐ遊歩道の整備や清水川の草木伐採をする「明神農道改良工事(その2)」を実施します。施工業者が決定しましたのでお知らせします。工事中は、遊歩道を通行止めとさせていただきます。また、清水川の伐採作業時に清水橋は片側通行となります。皆様にご迷惑とご不便をおかけしますが、ご理解・ご協力をよろしくお願いいたします。


【工事名】明神農道改良工事(その2)

【受注者】有限会社福山金網工業

【工期】2024年(令和6年)2月14日
～2024年(令和6年)3月29日

【問合せ先】

福山市建設局土木部港湾河川課
電話:084-928-1260

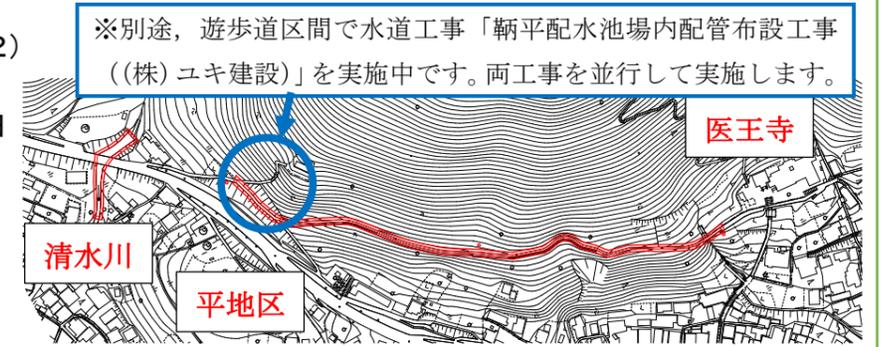

クルーズ客船の寄港について【福山市 港湾河川課】

昨年は、外国船の初寄港を含め、計7回のクルーズ客船の鞆沖寄港がありました。今年も1月の日本船「にっぽん丸」の寄港を含め、現在6回の寄港が予定されています。皆様のご理解・ご協力をよろしくお願いいたします。

今年の寄港予定(詳細は未定です)

日程	クルーズ船名	クルーズ船社・船籍	寄港方法
1月14日(日) (済)	にっぽん丸	商船三井 日本	沖合で停泊 通船で上陸
4月1日(月) 7:00～11:30	ル・ジャック・ カルティエ	ポナン社 フランス	沖合で停泊 ゴムボートで上陸
4月19日(金) 14:00～18:00	ル・ソリアル	ポナン社 フランス	沖合で停泊 ゴムボートで上陸
5月11日(土) 14:00～18:00	ル・ジャック・ カルティエ	ポナン社 フランス	沖合で停泊 ゴムボートで上陸
5月20日(月) 9:00～15:00	にっぽん丸	商船三井 日本	沖合で停泊 通船で上陸
10月5日(土) 7:00～12:00	ル・ソリアル	ポナン社 フランス	沖合で停泊 ゴムボートで上陸

【問合せ先】福山市建設局土木部港湾河川課
電話 084-928-1260

鞆港バス停付近の道路整備について【福山市 道路整備課】

開渠となっているバス転回所付近の道路側溝について、歩行者の安全確保のため修繕工事を行います。併せて、走島汽船船待合所の沿線道路の両側に区画線を施工します。

施工予定日が決まりましたのでお知らせします。

工事期間中は、片側交通等の規制を伴います。皆様にご迷惑をおかけしますが、ご理解とご協力をよろしくお願いいたします。

【工事名】道路修繕工事(鞆62号線外1路線)

【受注者】(有)大和コーポレーション(津之郷町)

【工期】2023年(令和5年)12月22日
～2024年(令和6年)3月29日

【施工予定日】2024年(令和6年)3月11日より
(一週間程度)

【問合せ先】福山市建設局土木部道路整備課
電話 084-928-1081

