


2016年度(平成28年度)福山市通学路合同点検実施箇所一覧表及び箇所図

地図番号	学校名	危険内容	事業主体・対策内容	実施済	備考
1	大津野	交通量が多い。道路が狭い。側溝への転落の恐れあり。	【市】 区画線(外側線)の引き直し カラー舗装(緑)の新設 ポストコーンの移設 他路線の整備による交通量の軽減		市道幕山台大門幹線 ※2014年度(平成26年度)からの 継続
2	大津野	通学時に交通量が多い。見通しが悪い。路肩がせまい。			2014年度合同点検にて対策 済。
3	大津野	歩行者スペースが狭い。道路が狭い。アスファルトとコンクリートと土の段差があって転倒の恐れあり。	【市】着手中 区画線(減速破線)の新設 区画線(外側線)の引き直し 他路線の整備による交通量の軽減		市道幕山台大門幹線 ※2014年度(平成26年度)からの 継続
4	大津野	交通量が多い。道路が狭い。側溝への転落の恐れあり。歩道等の境がない。	【学校・地域等】 通学路の変更		検討したが、変更後の方が危険と 判断されるため、通学路の変更 は難しい。
5	大津野	大きな水たまりがあり、車が通ると水しぶきが飛び、よけられない。	【国土交通省】 側溝・排水柵の清掃	○	
6	大津野	北側から来る道路からの視界が悪く自転車と衝突しそうになる。	【学校・地域等】 足型マークの設置(2ヶ所)	○	

2016年度(平成28年度)福山市通学路合同点検実施箇所一覧表及び箇所図

7	大津野	横断歩道が渡りにくいところにあり, 横断歩道以外の場所を渡っている。また, 路面標示が消えかかっている見えにくい。	【市】 路面標示(児童注意)の新設 【警察】 横断歩道の引き直し	○	
8	大津野	交通量が多い。歩行スペースが狭い。	【学校・地域等】済 民地に入らないように指導 【市】 区画線(外側線)(カラーリング)	○	市道 大門82号線 外2路線 ※2014年度(平成26年度)からの 継続 ※下水工事完了後施工
—	大津野	抜け道として利用している車が多く, スピードを落とさず入ってくるため危険。	【市】 路面標示		生活道路対策エリア

大津野小学校

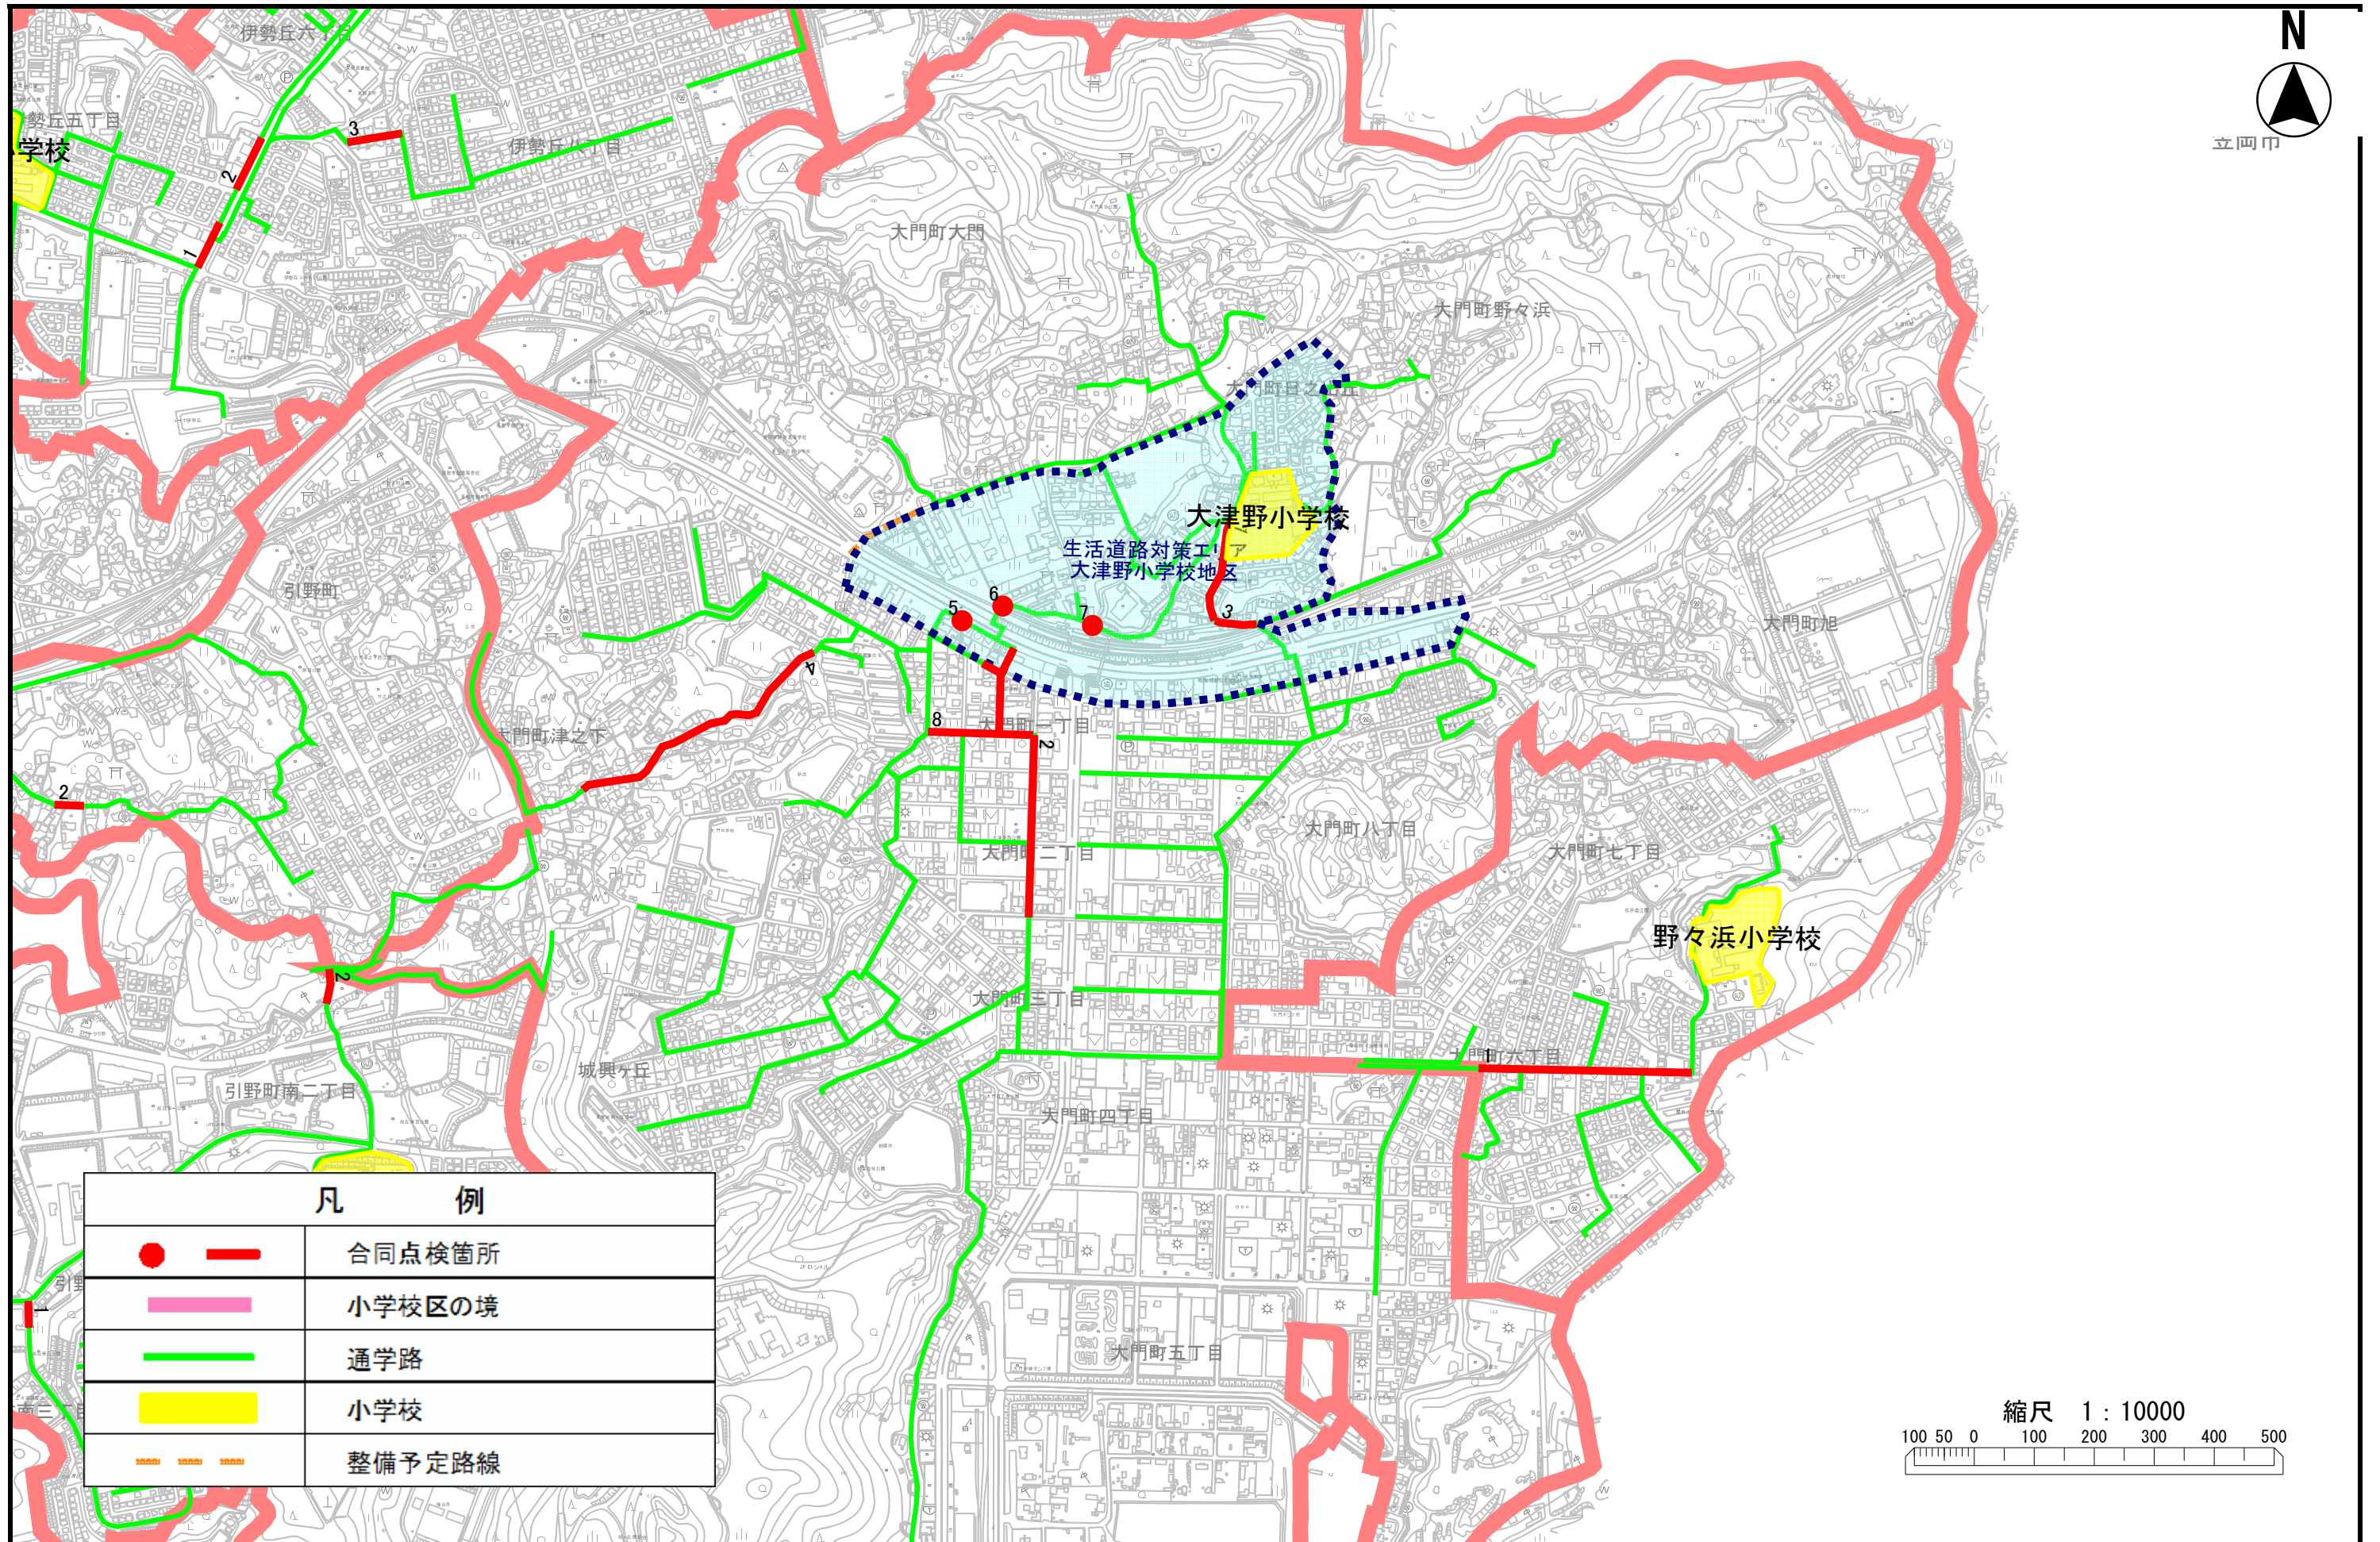

凡 例

	合同点検箇所
	小学校区の境
	通学路
	小学校
	整備予定路線

