






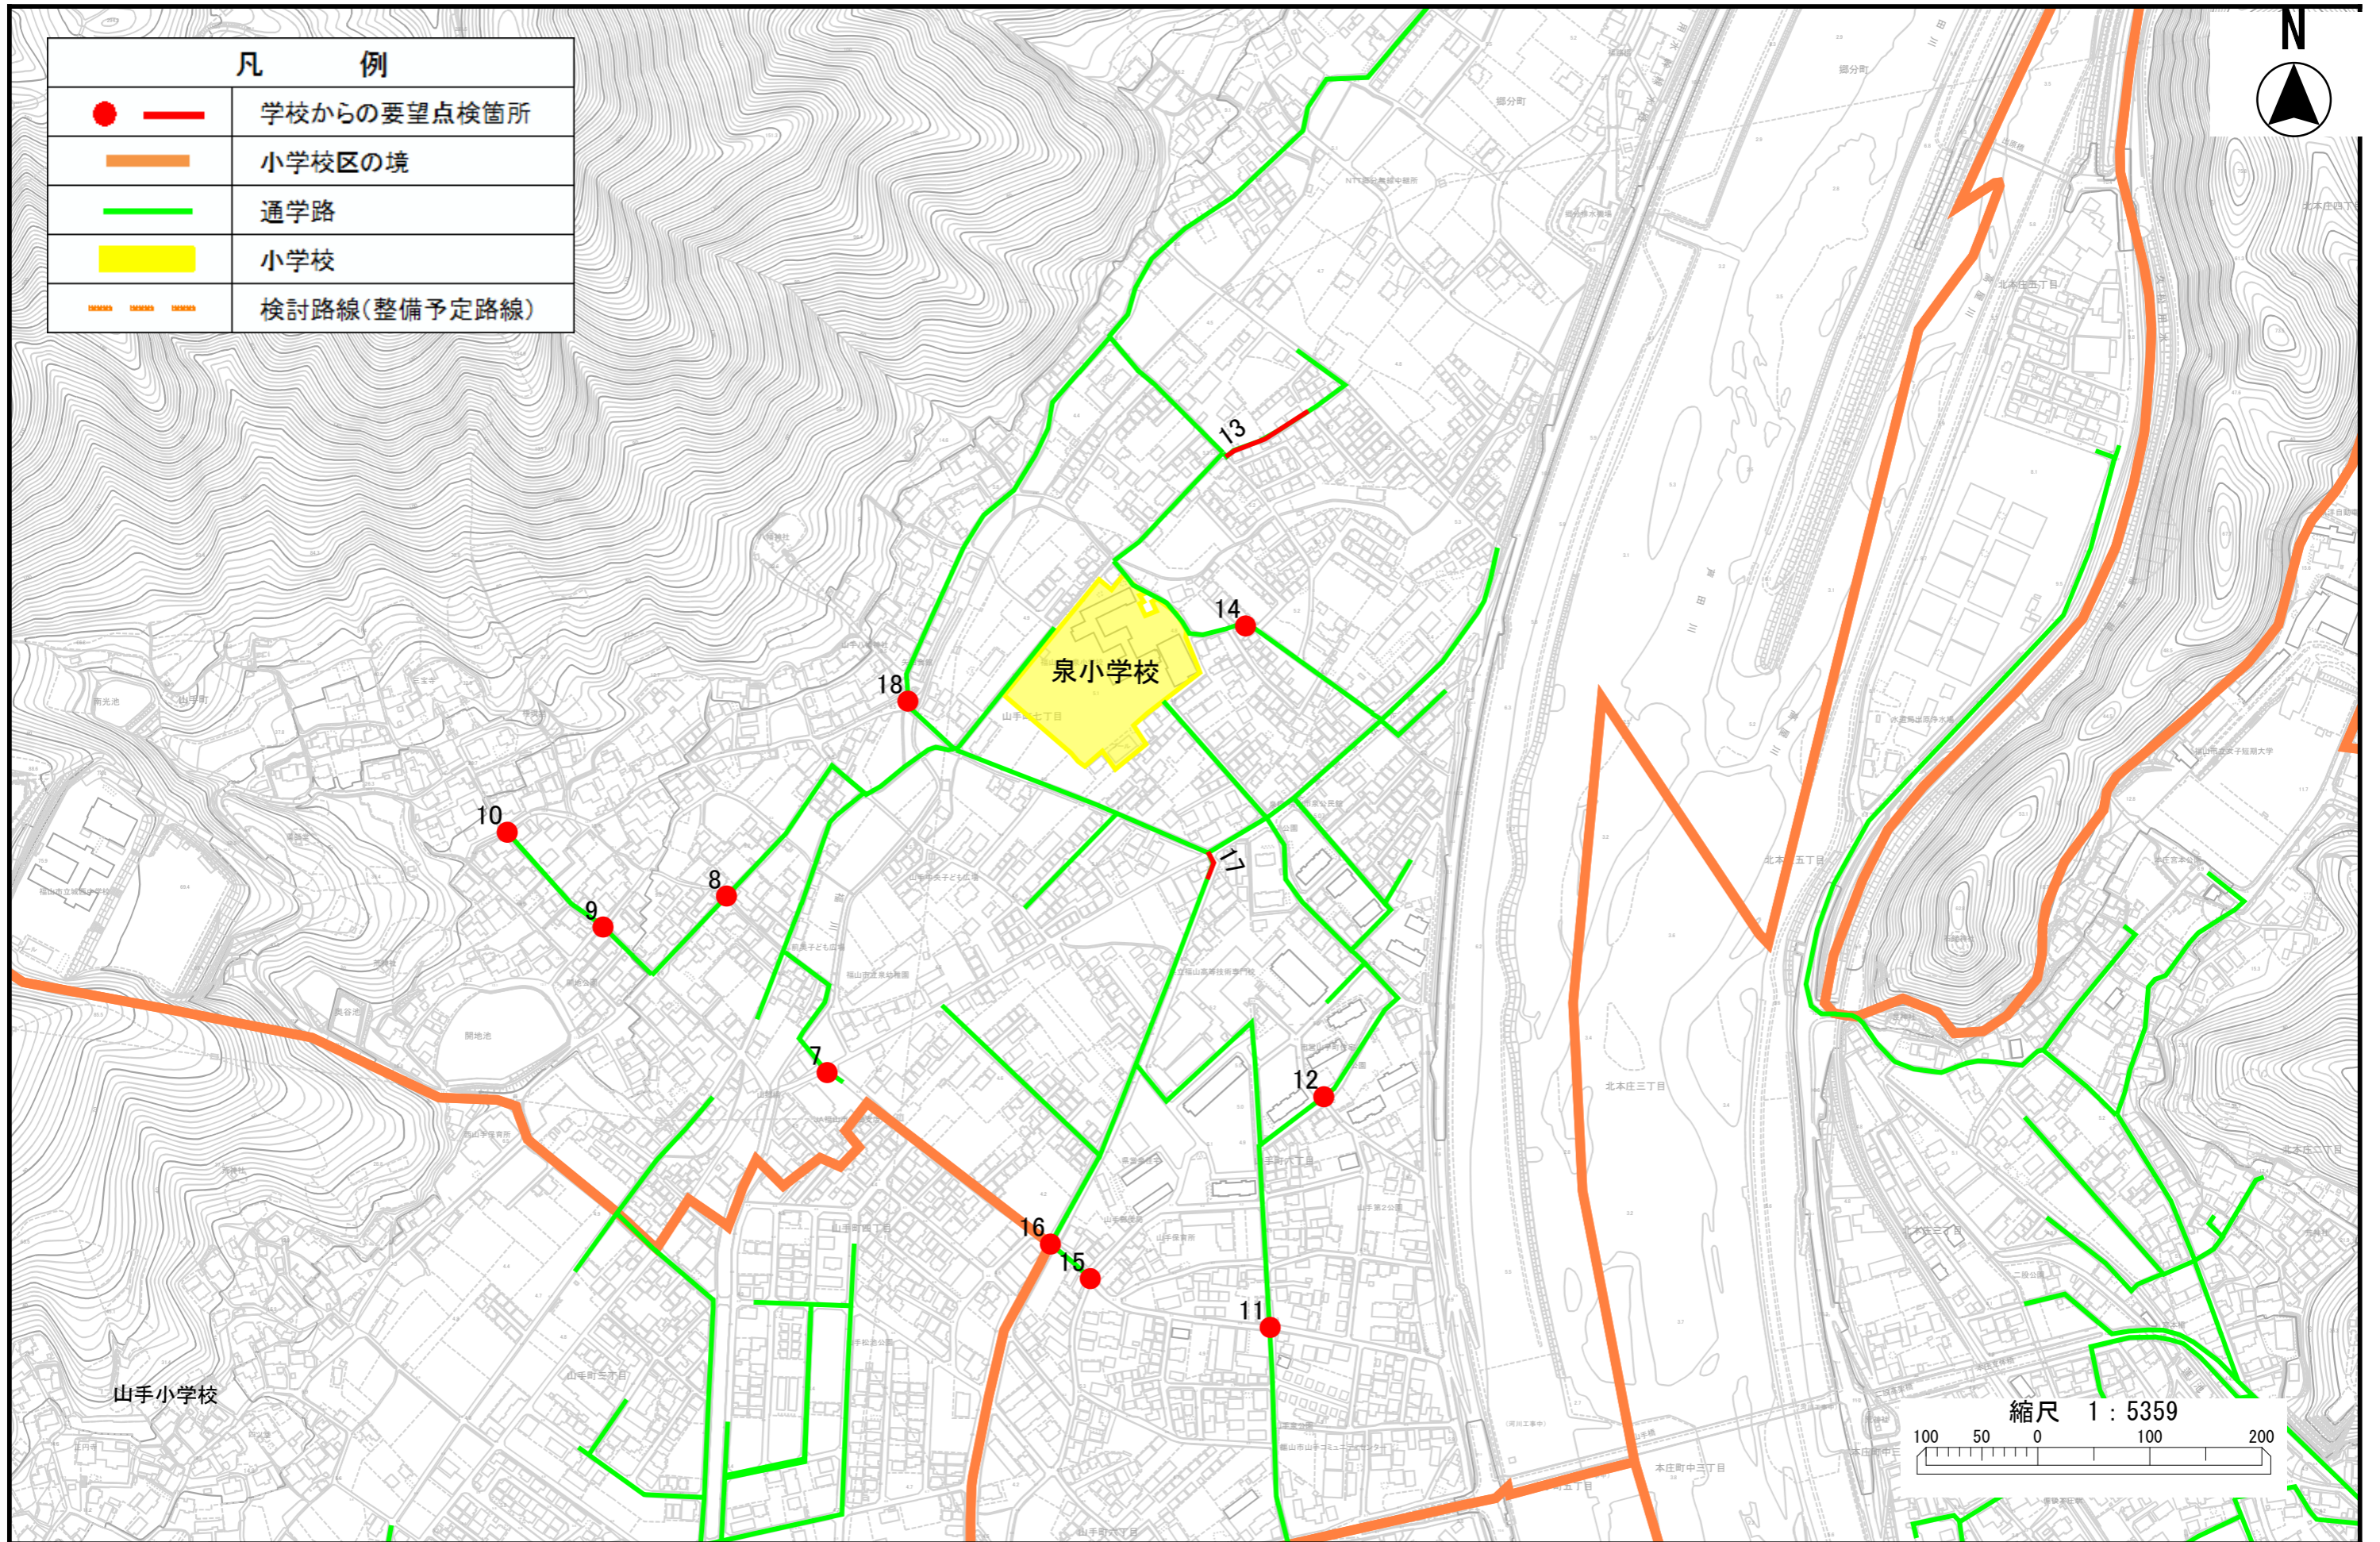


泉小学校(1)

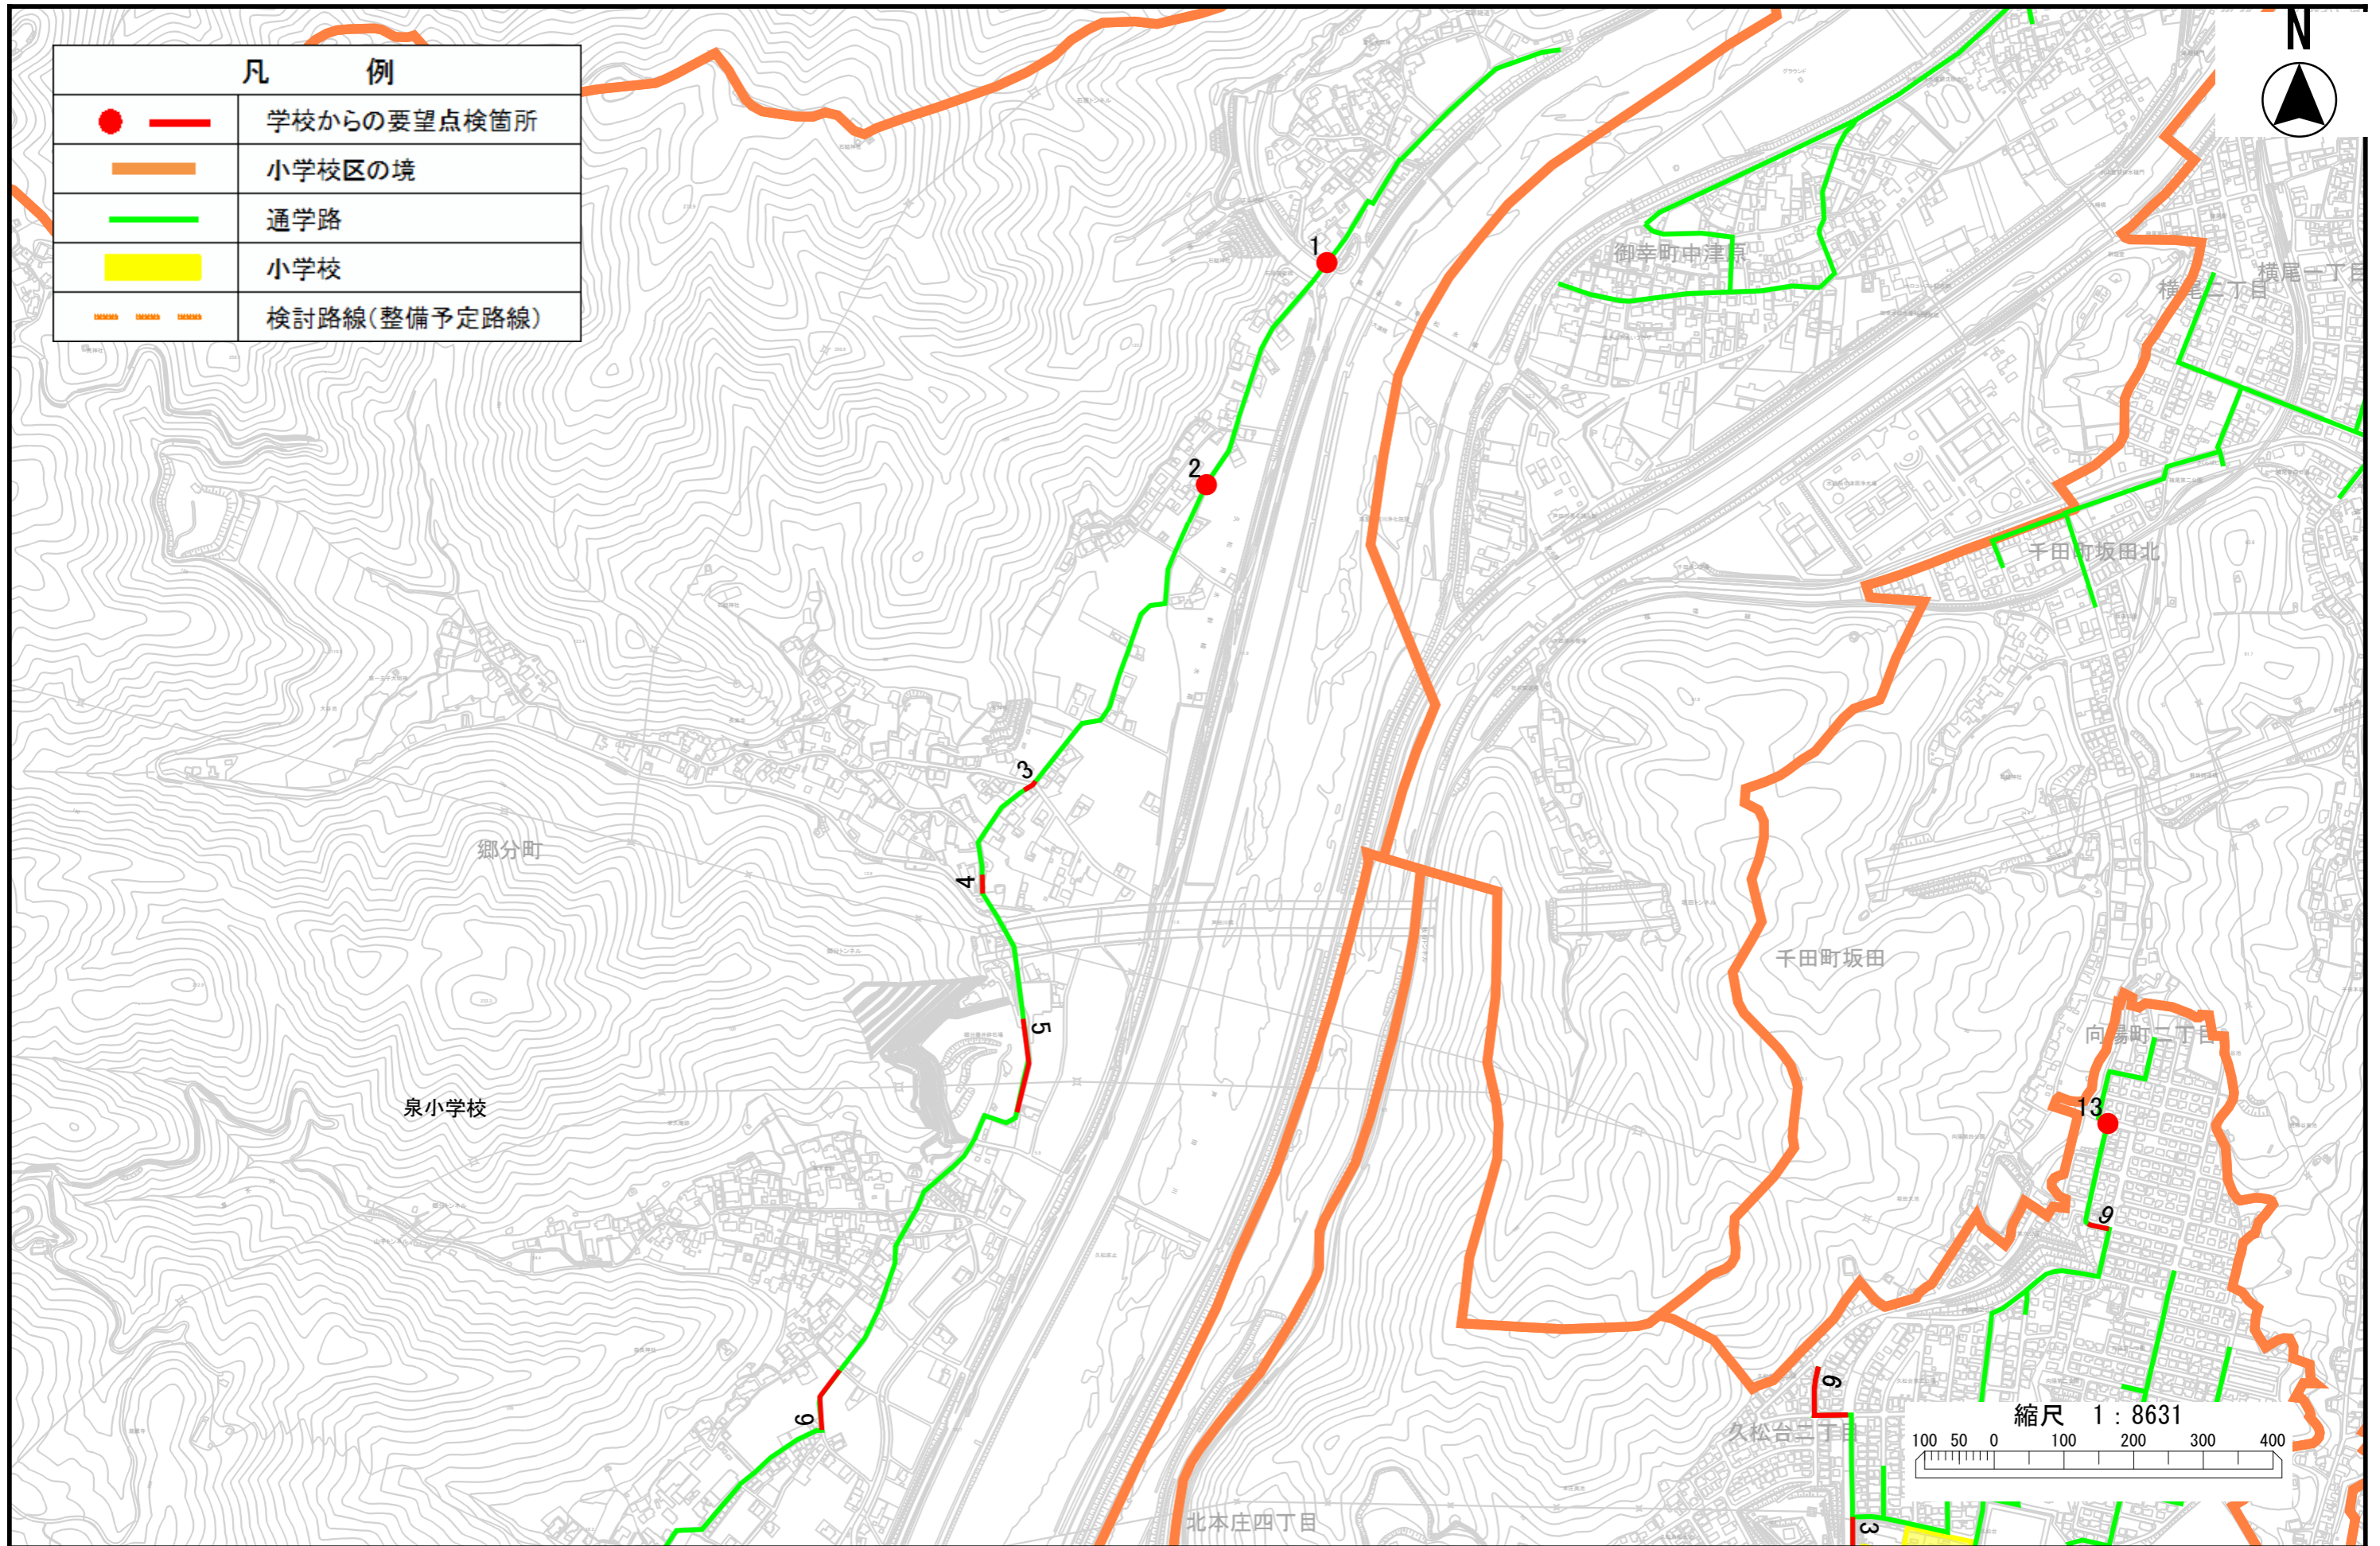

泉小学校(2)

| 凡 例 | |
|---|--------------|
|  | 学校からの要望点検箇所 |
|  | 小学校区の境 |
|  | 通学路 |
|  | 小学校 |
|  | 検討路線(整備予定路線) |



| 学校名 | 位置図 番号 | 通学路 点検 年度 | 危険内容 | 対策可否 ステータス | 通学路対策予定内容 できない理由 | 対策状況ステータス | 備考 |
|-----|-----------|-----------------|---|---------------|---|--------------|----|
| 泉 | 1 | 2020 | フェンスに取り付けている安全喚起看板の留め具が緩んでいる。 | 対策可 | 【学校・地域】 看板設置者へ修復依頼 | 点検内容がすべて対応完了 | |
| 泉 | 2 | 2020 | 道路が陥没している。 | 対策不可 | 私有地のため、様子見 | 点検内容がすべて対応完了 | |
| 泉 | 3 | 2020 | 7:30~8:30のスクールゾーンで、7:30までに間に合うように高速で入ってくる車両が多い。 | 対策可 | 【市】 路面標示(横断児童あり)の設置 (芦田川方面から山側へ向かう 車両に対して) ドット線の設置(両方向) | 点検内容がすべて対応完了 | |
| 泉 | 4 | 2020 | 集団登校の集合場所近所のデイスービスの車両がよく通る。 | 対策可 | 【市】 路面標示(横断児童あり)の設置 ドット線の設置(両方向) | 点検内容がすべて対応完了 | |
| 泉 | 5 | 2020 | ガードパイプが設置されていない。 | 対策可 | 【市】 転落防止柵の設置(地権者の了 承を得た後) | 点検内容がすべて対応完了 | |

| 学校名 | 位置図 番号 | 通学路 点検 年度 | 危険内容 | 対策可否 ステータス | 通学路対策予定内容 できない理由 | 対策状況ステータス | 備考 |
|-----|-----------|-----------------|---------------------------------------|---------------|---|--------------|---|
| 泉 | 6 | 2018 | 柵がない。 | 対策可 | 【市】 外側線の引き直し グリーンベルトの設置(路側帯の カラー化) | 対応中 | 2018年度(平成30年度)からの継 続[点検箇所番号2] 転落防止柵の設置は、地域の同 意を得ることができなかった |
| 泉 | 7 | 2020 | 交通量が多く、三差路道路に横断歩道がない。 | 対策可 | 【市】 ゼブラマークの設置 | 点検内容がすべて対応完了 | 横断歩道は、ゼブラマークの効 果を踏まえて検討する |
| 泉 | 8 | 2020 | 大きい道路へ出る車両が、一時停止せず直進して 危険。 | 対策可 | 【市】 交差点マーク・ドット線の設置 | 点検内容がすべて対応完了 | |
| 泉 | 9 | 2020 | カーブミラーは設置しているが、道幅が狭く、壁や建 物で見通しが悪い。 | 対策不可 | 路面標示等の対策を実施済み のため、対策不要 | 点検内容がすべて対応完了 | |
| 泉 | 10 | 2020 | カーブミラーは設置しているが、道幅が狭く、壁や建 物で見通しが悪い。 | 対策可 | 【市】 交差点マークの設置 | 点検内容がすべて対応完了 | |

| 学校名 | 位置図 番号 | 通学路 点検 年度 | 危険内容 | 対策可否 ステータス | 通学路対策予定内容 できない理由 | 対策状況ステータス | 備考 |
|-----|-----------|-----------------|---------------------------------|---------------|--|--------------|----|
| 泉 | 11 | 2020 | 登校中車が停車しない。横断歩道の白線が消えかかっている。 | 対策可 | 【警察】 横断歩道の引き直し 【市】 ゼブラマークの設置 | 点検内容がすべて対応完了 | |
| 泉 | 12 | 2020 | 横断歩道で停車しない。横断歩道の白線が消えかかっている。 | 対策可 | 【警察】 横断歩道の引き直し 【市】 路面標示(横断児童注意)の設置(両方向) | 点検内容がすべて対応完了 | |
| 泉 | 13 | 2020 | 道幅が狭く、水路に蓋の設置が必要。境の土留ブロックが崩れそう。 | 対策可 | 【学校・地域】 標示看板の設置 所有者への声掛け | 点検内容がすべて対応完了 | |

| 学校名 | 位置図 番号 | 通学路 点検 年度 | 危険内容 | 対策可否 ステータス | 通学路対策予定内容 できない理由 | 対策状況ステータス | 備考 |
|-----|-----------|-----------------|------------------------------|---------------|--|--------------|----|
| 泉 | 14 | 2020 | カーブで見通しが悪いので、カーブミラーを増やしてほしい。 | 対策可 | 【市】 路面標示(減速)の設置 外側線・グリーンベルトの設置 【学校・地域】 標示看板の設置 | 点検内容がすべて対応完了 | |
| 泉 | 15 | 2020 | 見通しの悪い十字路で危険である。 | 対策可 | 【警察】 横断歩道の引き直し 一時停止規制の修復 【市】 路面標示(減速)の設置 | 点検内容がすべて対応完了 | |
| 泉 | 16 | 2020 | 路面標示が消えている。幅員の狭い道路で危険。 | 対策可 | 【警察】 一時停止規制の修復 【市】 路面標示(減速)の設置 | 点検内容がすべて対応完了 | |

| 学校名 | 位置図 番号 | 通学路 点検 年度 | 危険内容 | 対策可否 ステータス | 通学路対策予定内容 できない理由 | 対策状況ステータス | 備考 |
|-----|-----------|-----------------|---|---------------|--|--------------|--------------------|
| 泉 | 17 | 2020 | 複雑な交差点となっており、ガードパイプや路面標の対策がされているが、見通しが悪く危険。 | 対策可 | 【市】 路面標示(横断児童注意)の設置 【学校・地域】対応完了 見守り指導(ガードパイプ内の通行) | 対応中 | 【市】 2022年度に実施予定 |
| 泉 | 18 | 2020 | 通学路沿いの窪地であり、児童が転落する危険性がある。 | 対策不可 | 蓋掛け(県)は対応困難 ポストコーン(市)であれば対応可能だが、地域の同意を得られていないため、対策保留 | 点検内容がすべて対応完了 | |
