


戸手小学校

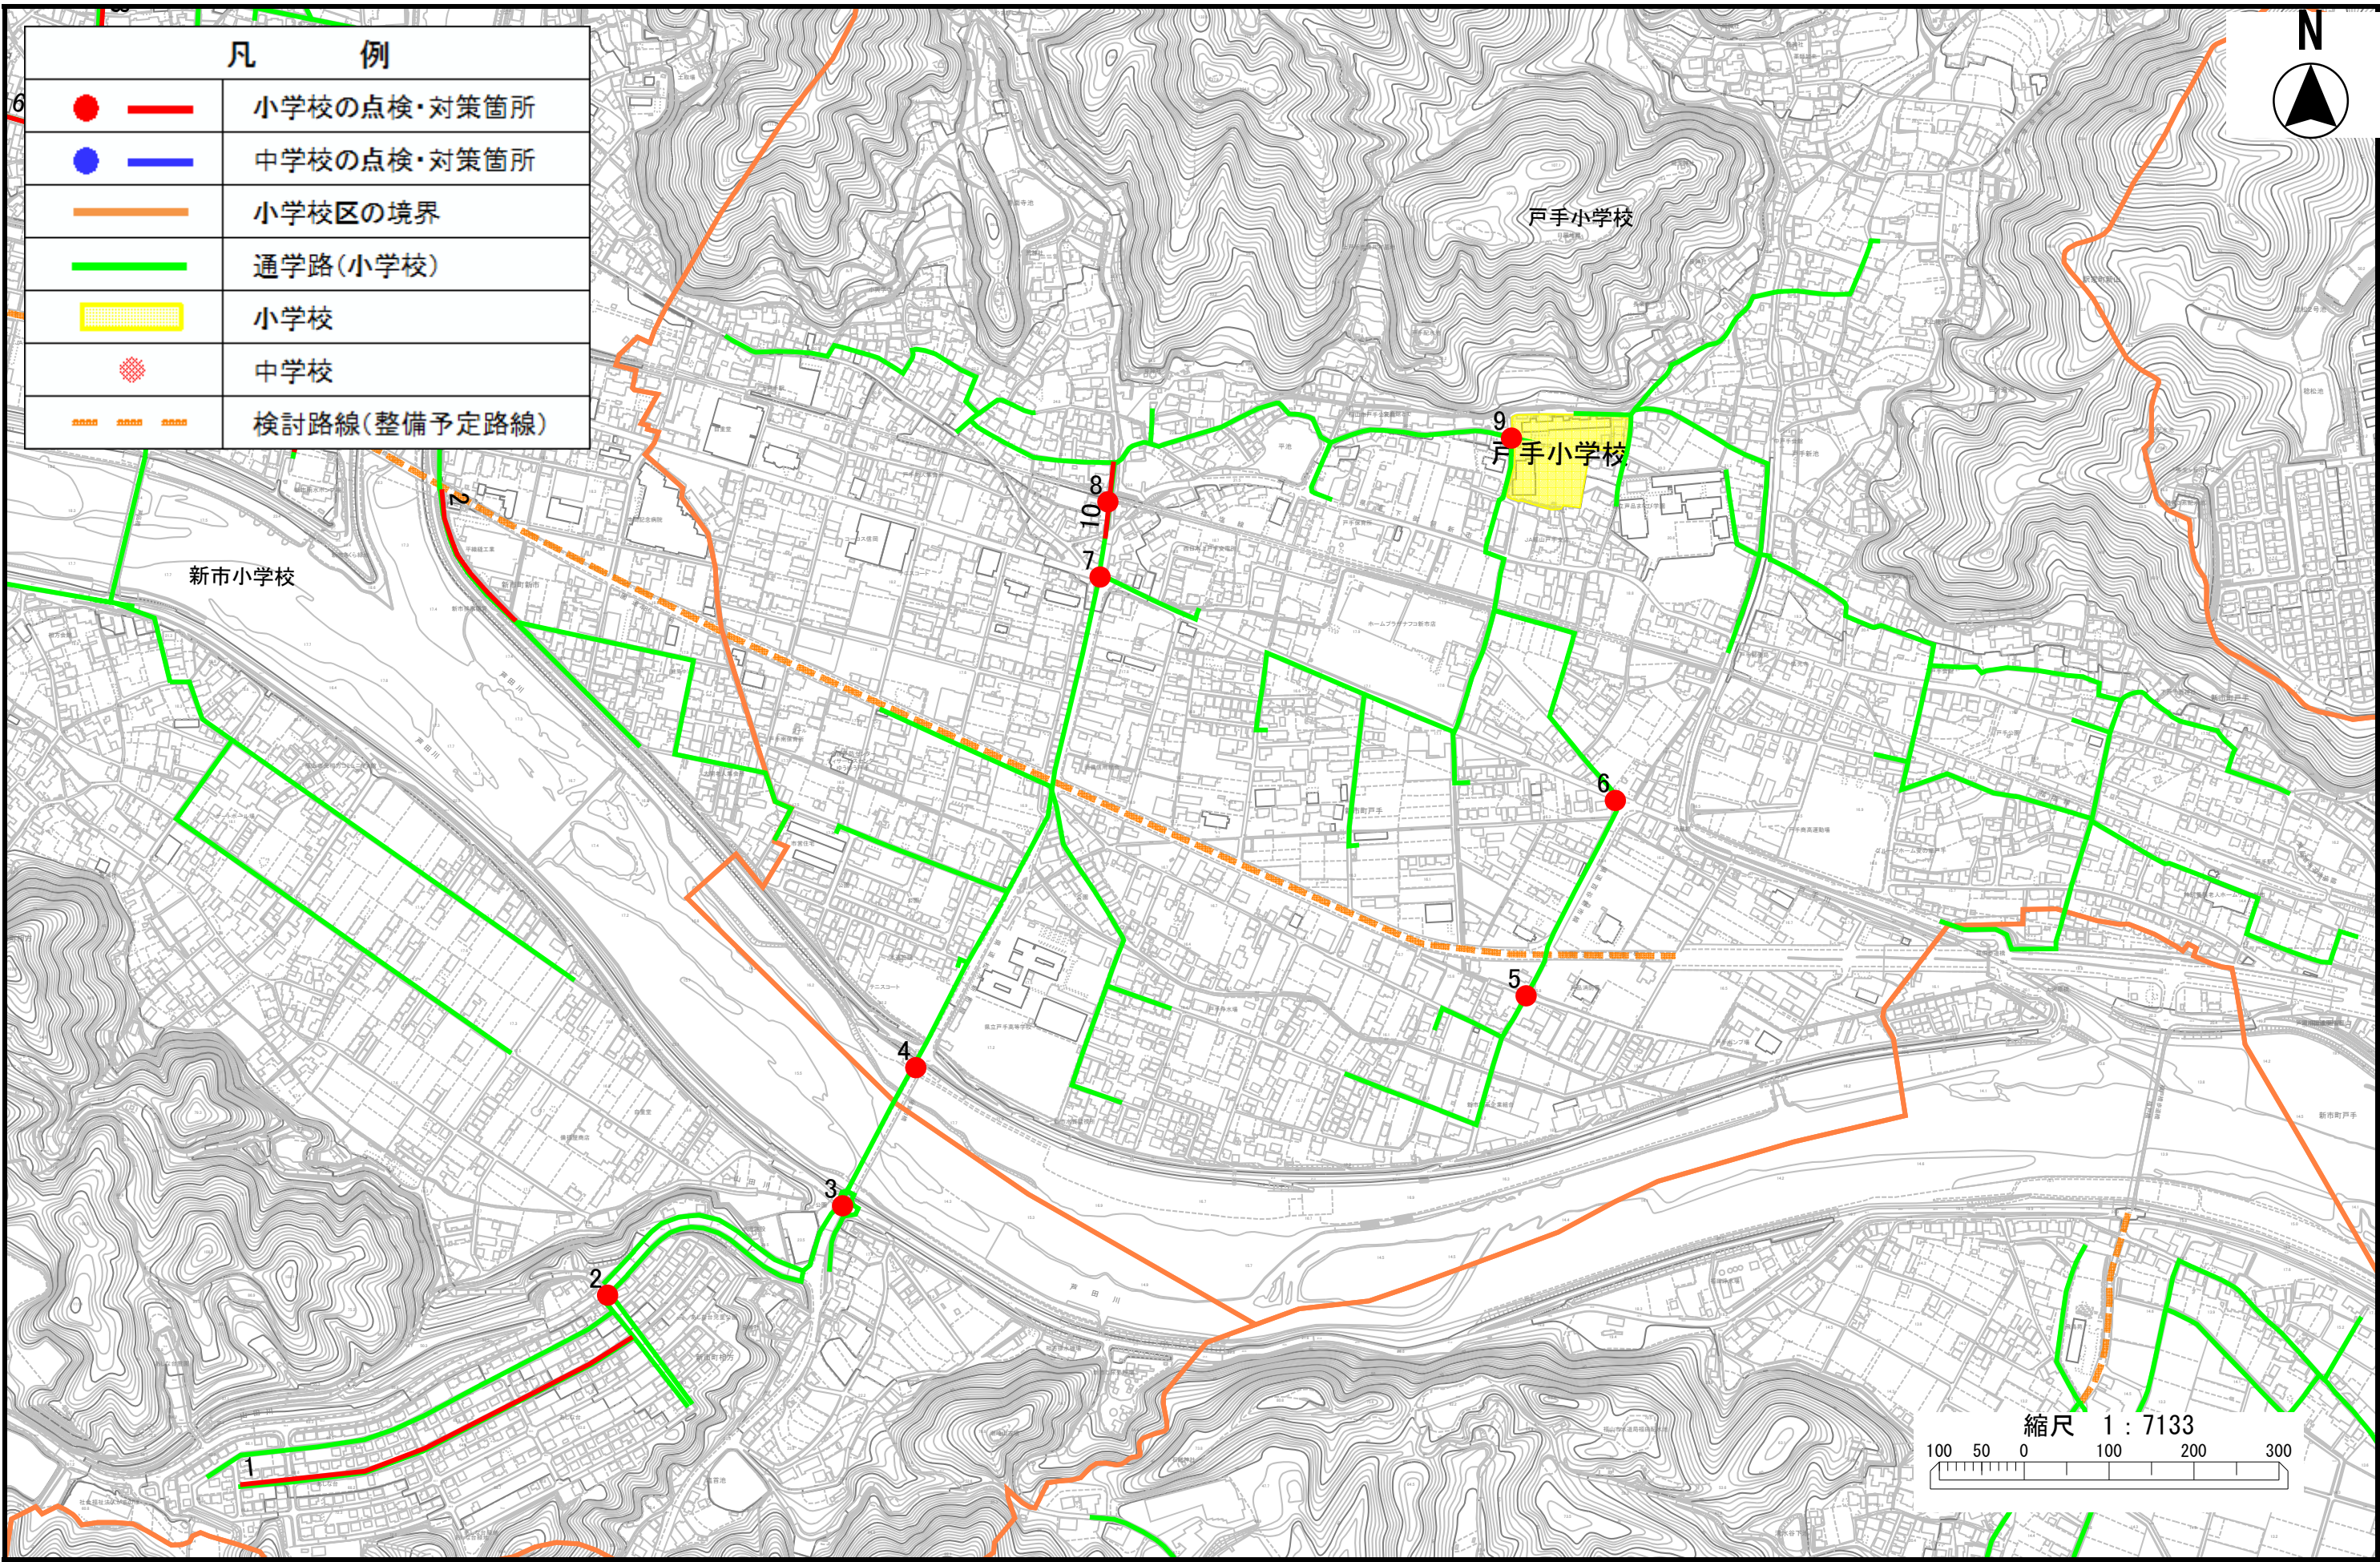

学校名	位置図 番号	通学路 点検年度	危険内容	通学路対策予定内容/できない理由	対策状況 ステータス	備考
戸手小	1	2020	団地内に歩道がある唯一の道路であるが、外側線が消えて全くない。団地内の各交差点は見通しが悪い。	【市】 外側線の引き直し（範囲が広いため、数年かけて実施）	全て対応完了	2020年度(令和2年度)からの継続[点検箇所番号 1]
戸手小	2	2020	坂から上がってくる交差点には横断歩道があるが、見通しが悪いので、交差点に「止まれ」の道路標示や、カーブミラーを設置するとよい。	【市】 ドット線の設置	全て対応完了	2020年度(令和2年度)からの継続[点検箇所番号 2]
戸手小	3	2022	横断歩道の白線が消えかかっている。 車が歩道に乗り上げることがあり、危険である。 2022年6月19日にも、車両3台が絡む衝突事故があった。 交通事故の要因は、交差点に向けて、堤防道路がラウンドしているためだと考えられる。（交差点内に近づかないと見通しがきかない）	【県】 ラバーポールの設置	全て対応完了	
戸手小	4	2022	車の交通量も多く、信号機がないので、児童が横断する時に危険である。	【市】 路面標示設置済みのため、経過観察	経過観察	路面標示は設置済のため、経過観察

学校名	位置図 番号	通学路 点検年度	危険内容	通学路対策予定内容/できない理由	対策状況 ステータス	備考
戸手小	5	2022	道幅が狭く、側溝もあり、児童が車と接触したり、側溝に落ちたりする危険がある。	【市】 水路の蓋掛け	全て対応完了	
戸手小	6	2022	横断歩道はあるが、信号機がない。交通量が非常に多く、横断が困難である。 道路に勾配があり、横断歩道があっても、歩行者に気付きにくい。	【警察】 取締りの実施 【市】 路面標示（通学路）の設置 【学校・地域】 横断旗の設置	全て対応完了	【警察】 信号機は、要望リストに記載済み 信号機は、設置に際して北側道路の一方通行化が必要
戸手小	7	2022	外側線が消えているので、車が歩道に寄ってくる。	【県】 外側線の引き直し	全て対応完了	【県】 戸手高校入口交差点から上戸手中交差点まで復旧完了
戸手小	8	2022	児童が、橋から線路に転落する可能性がある。	【市】 転落防止柵の設置 路面等舗装補修（路肩）	全て対応完了	R6取下げ
戸手小	9	2019	学校の校門（西側）を出た交差点の見通しが悪いため危険。	【市】 グリーンベルトの設置 外側線の引き直し	全て対応完了	2020年度(令和2年度)からの継続分[点検箇所番号 10]

学校名	位置図 番号	通学路 点検年度	危険内容	通学路対策予定内容/できない理由	対策状況 ステータス	備考
戸手小	10	2021	離合が困難な幅3.5m前後の狭い道が続く。（新市戸手1号線：石見銀山街道）児童が車とすれ違う度に退避スペースに身を寄せて、車が通り過ぎるのを待っている。	【警察】 規制標識の変更 【市】 路面標示（この先通学路）の設置 【学校・地域】 見守り指導の実施	全て対応完了	2020年度(令和2年度)からの継続[点検箇所番号 1 1] 【警察】 土地所有者の了解を得ることができたため、補助標識を1本増設済み 【学校・地域】 地域住民の要望がまとまれば、時間規制の追加設置を警察に要望する
