

## 2018年度(平成30年度)福山市通学路合同点検実施箇所一覧表及び箇所図

地図番号	学校名	危険内容	事業主体・対策内容	実施済	備考
1	宜山	道路下の深い用水路に転落の恐れ、樋管暗渠入口で危険大	【市】 ガードレールの新設		
2	宜山	道路端のアスファルトが崩壊している、躓き転倒の危険	【市】 外側線の設置 舗装の補修		
3	宜山	道路脇に水路があり、転落の恐れがある、下流に暗渠あり危険大	【市】 転落防止柵の設置		
4	宜山	道路脇下部に畑があり、転落の恐れがある	【市】 転落防止柵(貼付タイプ)の設置		地域の同意が必要
5	宜山	道路脇の深い水路に転落の恐れガードレール途切れ、樋門暗渠入口危険大	【市】 ガードレールの新設		
6	宜山	道路脇に用水路があり、転落の恐れがある(町内会運動場隣接、頻度大)	【市】 転落防止柵の設置 隅切りの設置		

## 2018年度(平成30年度)福山市通学路合同点検実施箇所一覧表及び箇所図

地図番号	学校名	危険内容	事業主体・対策内容	実施済	備考
7	宜山	県道脇の狭い歩道、児童が一行で何とか通れるが、児童同士の接触車道へはみ出る児童がいる、自転車等通行車両も多く危険大		/	【学校・地域】 田んぼの畦道は細く雨の日の転倒が心配なため、通学路変更はしない。当面は現状ルートを通行する。
8	宜山	県道脇の歩道から市道26号線進入時、児童が広がって歩く、通行車両多く危険、溝蓋グレーチング上が滑りやすい(特に降雨、濡れている時)	【市】 外側線の設置 路側帯のカラー化 グレーチングの更新(滑止)	○	
9	宜山	道路両脇に用水路があり、転落の恐れがある	【市】 転落防止柵の設置		
10	宜山	未舗装路面がマンホール等の凹凸あり躓き転倒の恐れがある	【市】 舗装の補修		地域の同意が必要
11	宜山	道路脇に水路があり、転落の恐れがある(蓋掛け部点在)	【県】 転落防止柵の設置	○	
12	宜山	道路脇に用水路があり、転落の恐れがある	【市】 転落防止柵の設置		


## 2018年度(平成30年度)福山市通学路合同点検実施箇所一覧表及び箇所図

地図番号	学校名	危険内容	事業主体・対策内容	実施済	備考
13	宜山	道路脇に用水路があり、転落の恐れがある	【市】 転落防止柵の設置		
14	宜山	アスファルト路面が凹凸で転倒の恐れがある。特に自転車は危険である	【市】 舗装の補修 水路の設置		地域の同意が必要
15	宜山	道路脇に用水路があり、転落の恐れがある(蓋掛け部点在)	【市】 転落防止柵の設置		2020年度完了予定
16	宜山	道路内の水路用柵蓋部に開口部があり、躓き転倒の恐れがある	【市】 グレーチング柵に更新		
17	宜山	道路脇に用水路があり、転落の恐れがある	【市】 転落防止柵の設置		
18	宜山	水路に転落の危険がある	【市】 転落防止柵の設置		

## 2018年度(平成30年度)福山市通学路合同点検実施箇所一覧表及び箇所図

地図番号	学校名	危険内容	事業主体・対策内容	実施済	備考
19	宜山	水路に転落の危険がある	【市】 転落防止柵の設置		
20	宜山	路面が凸凹で転倒の恐れがある。	【市】 舗装補修		市道 上山守24号線 ※2014年度(平成26年度)からの 継続
21	宜山	水路へ転落の恐れがある。	【市】 転落防止柵の設置		市道 今岡上山守1号線 ※2014年度(平成26年度)からの 継続
22	宜山	川に転落する恐れがある。	【市】 転落防止柵の設置		市道 大橋18号線 ※2014年度(平成26年度)からの 継続  2020年度完了予定

# 宜山小学校

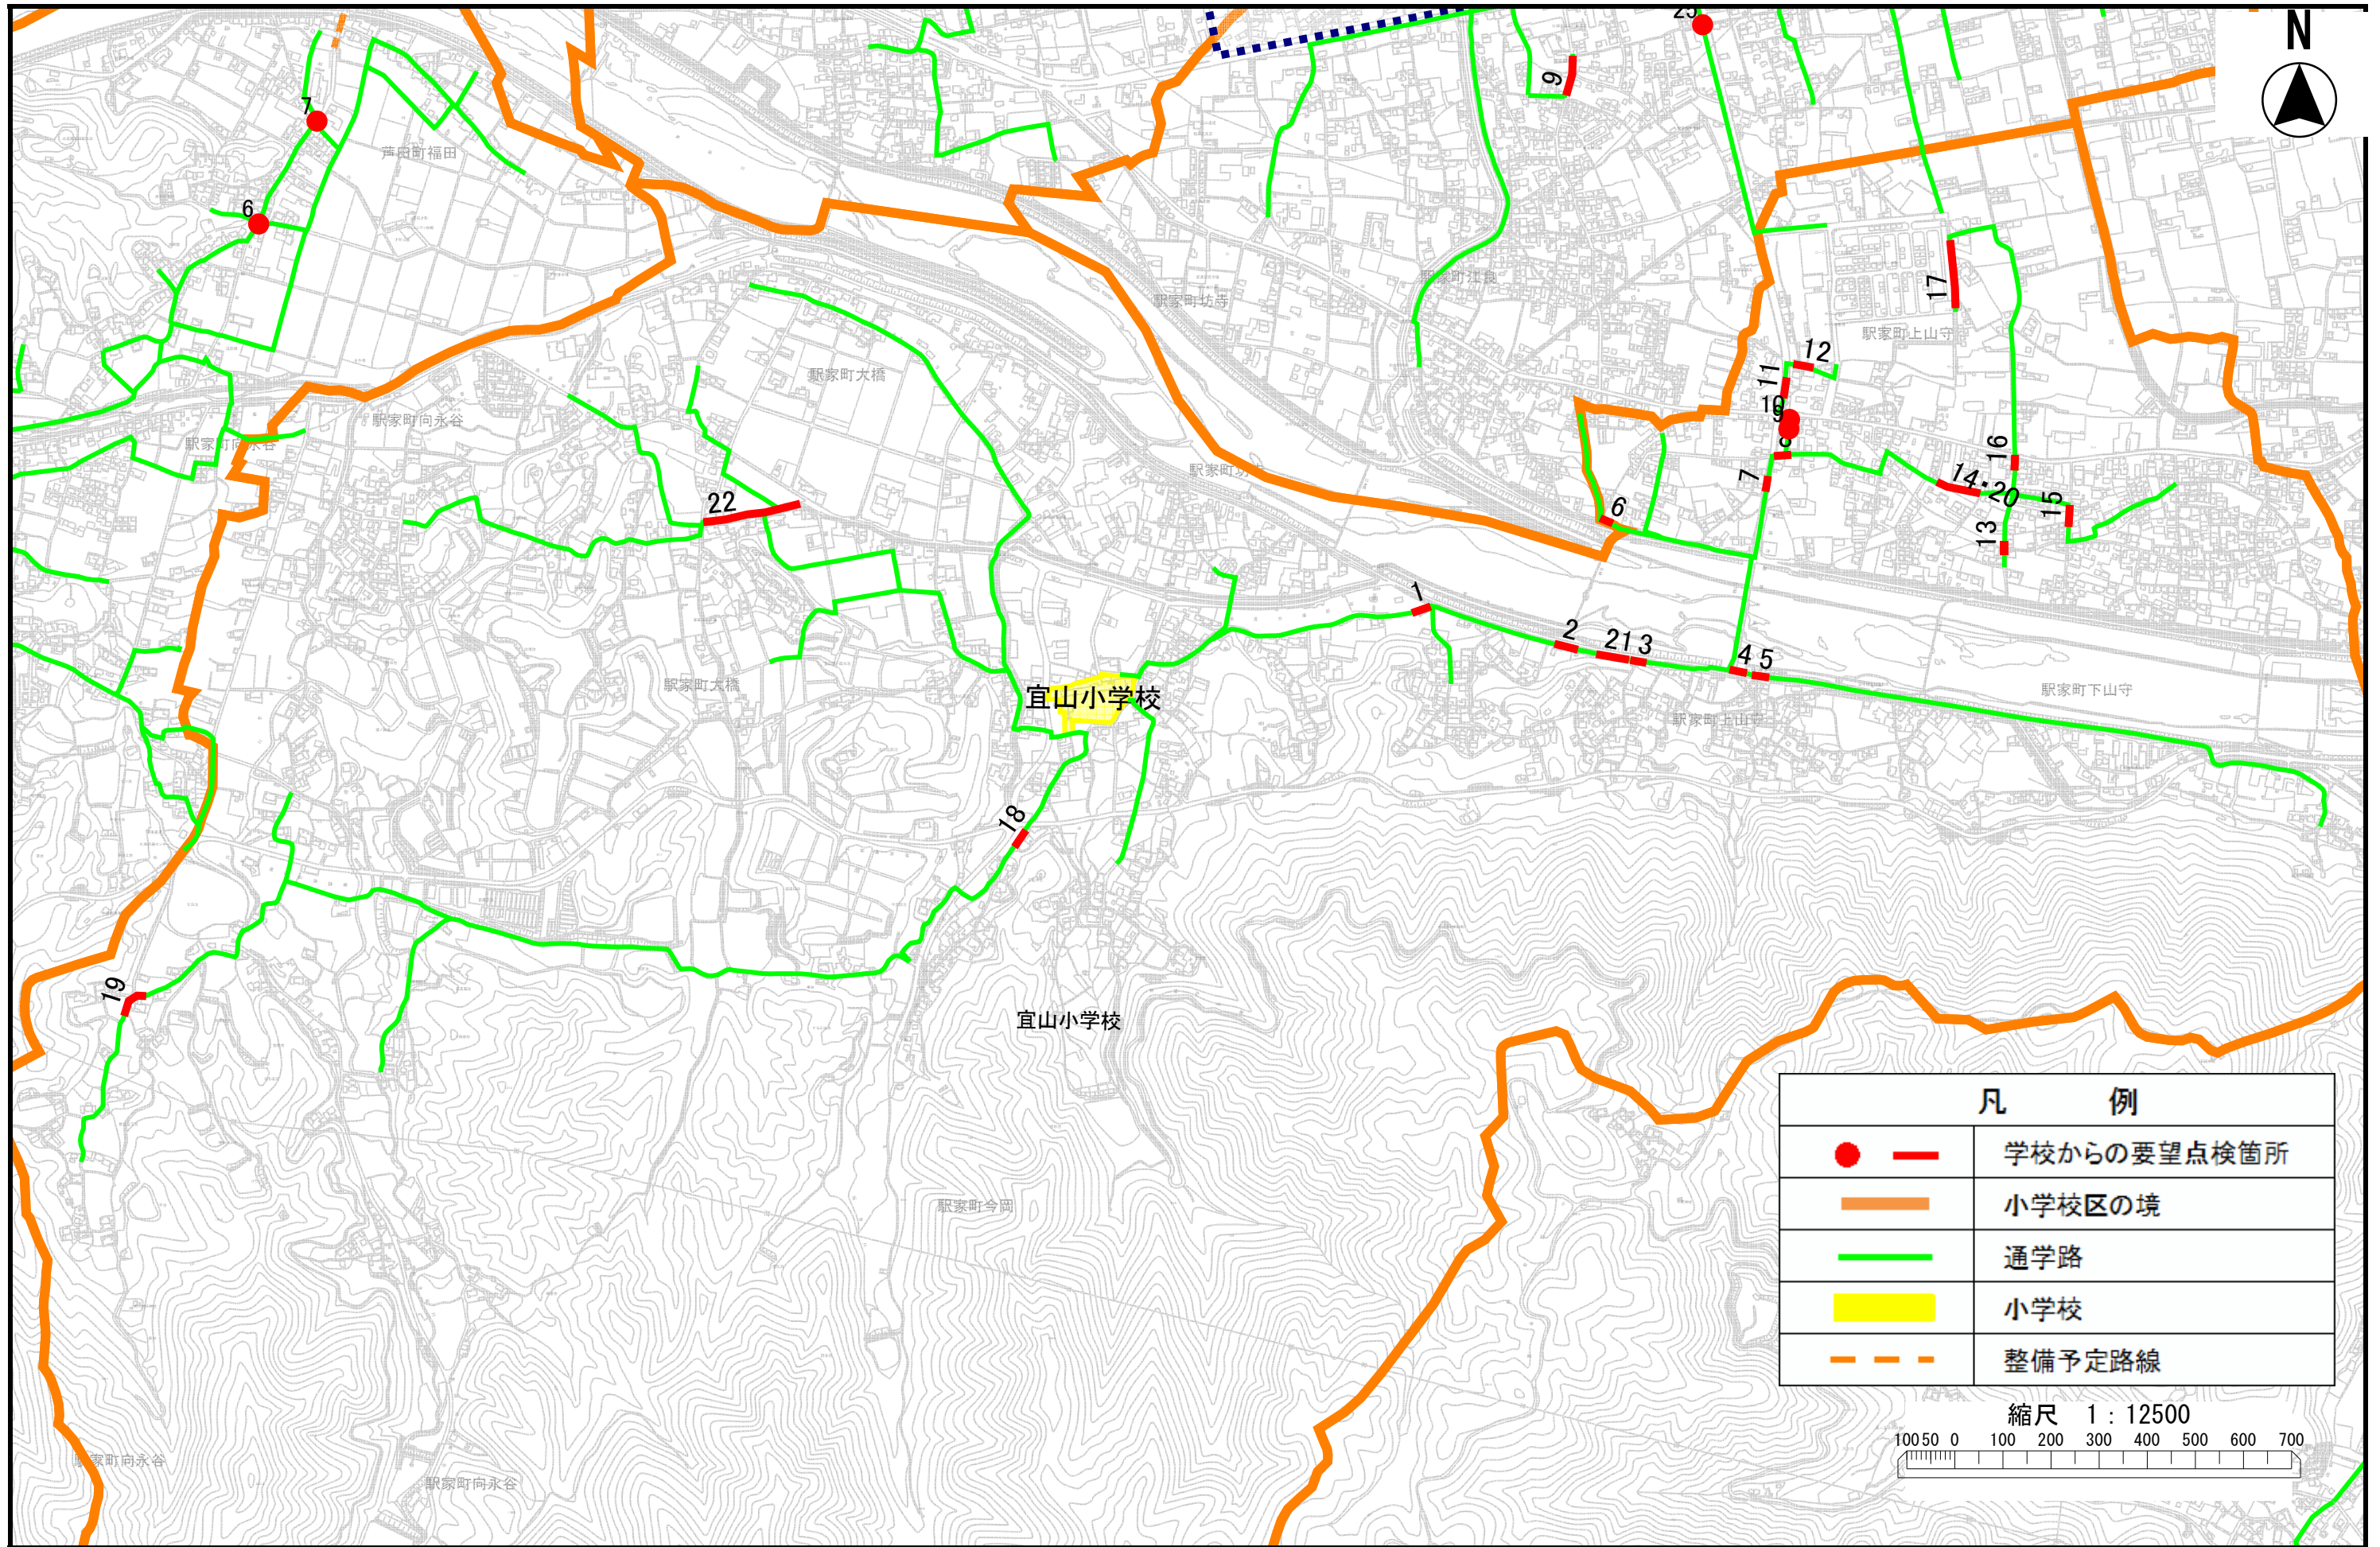

凡 例	
● —	学校からの要望点検箇所
—	小学校区の境
—	通学路
■	小学校
- - -	整備予定路線

