川口小学校

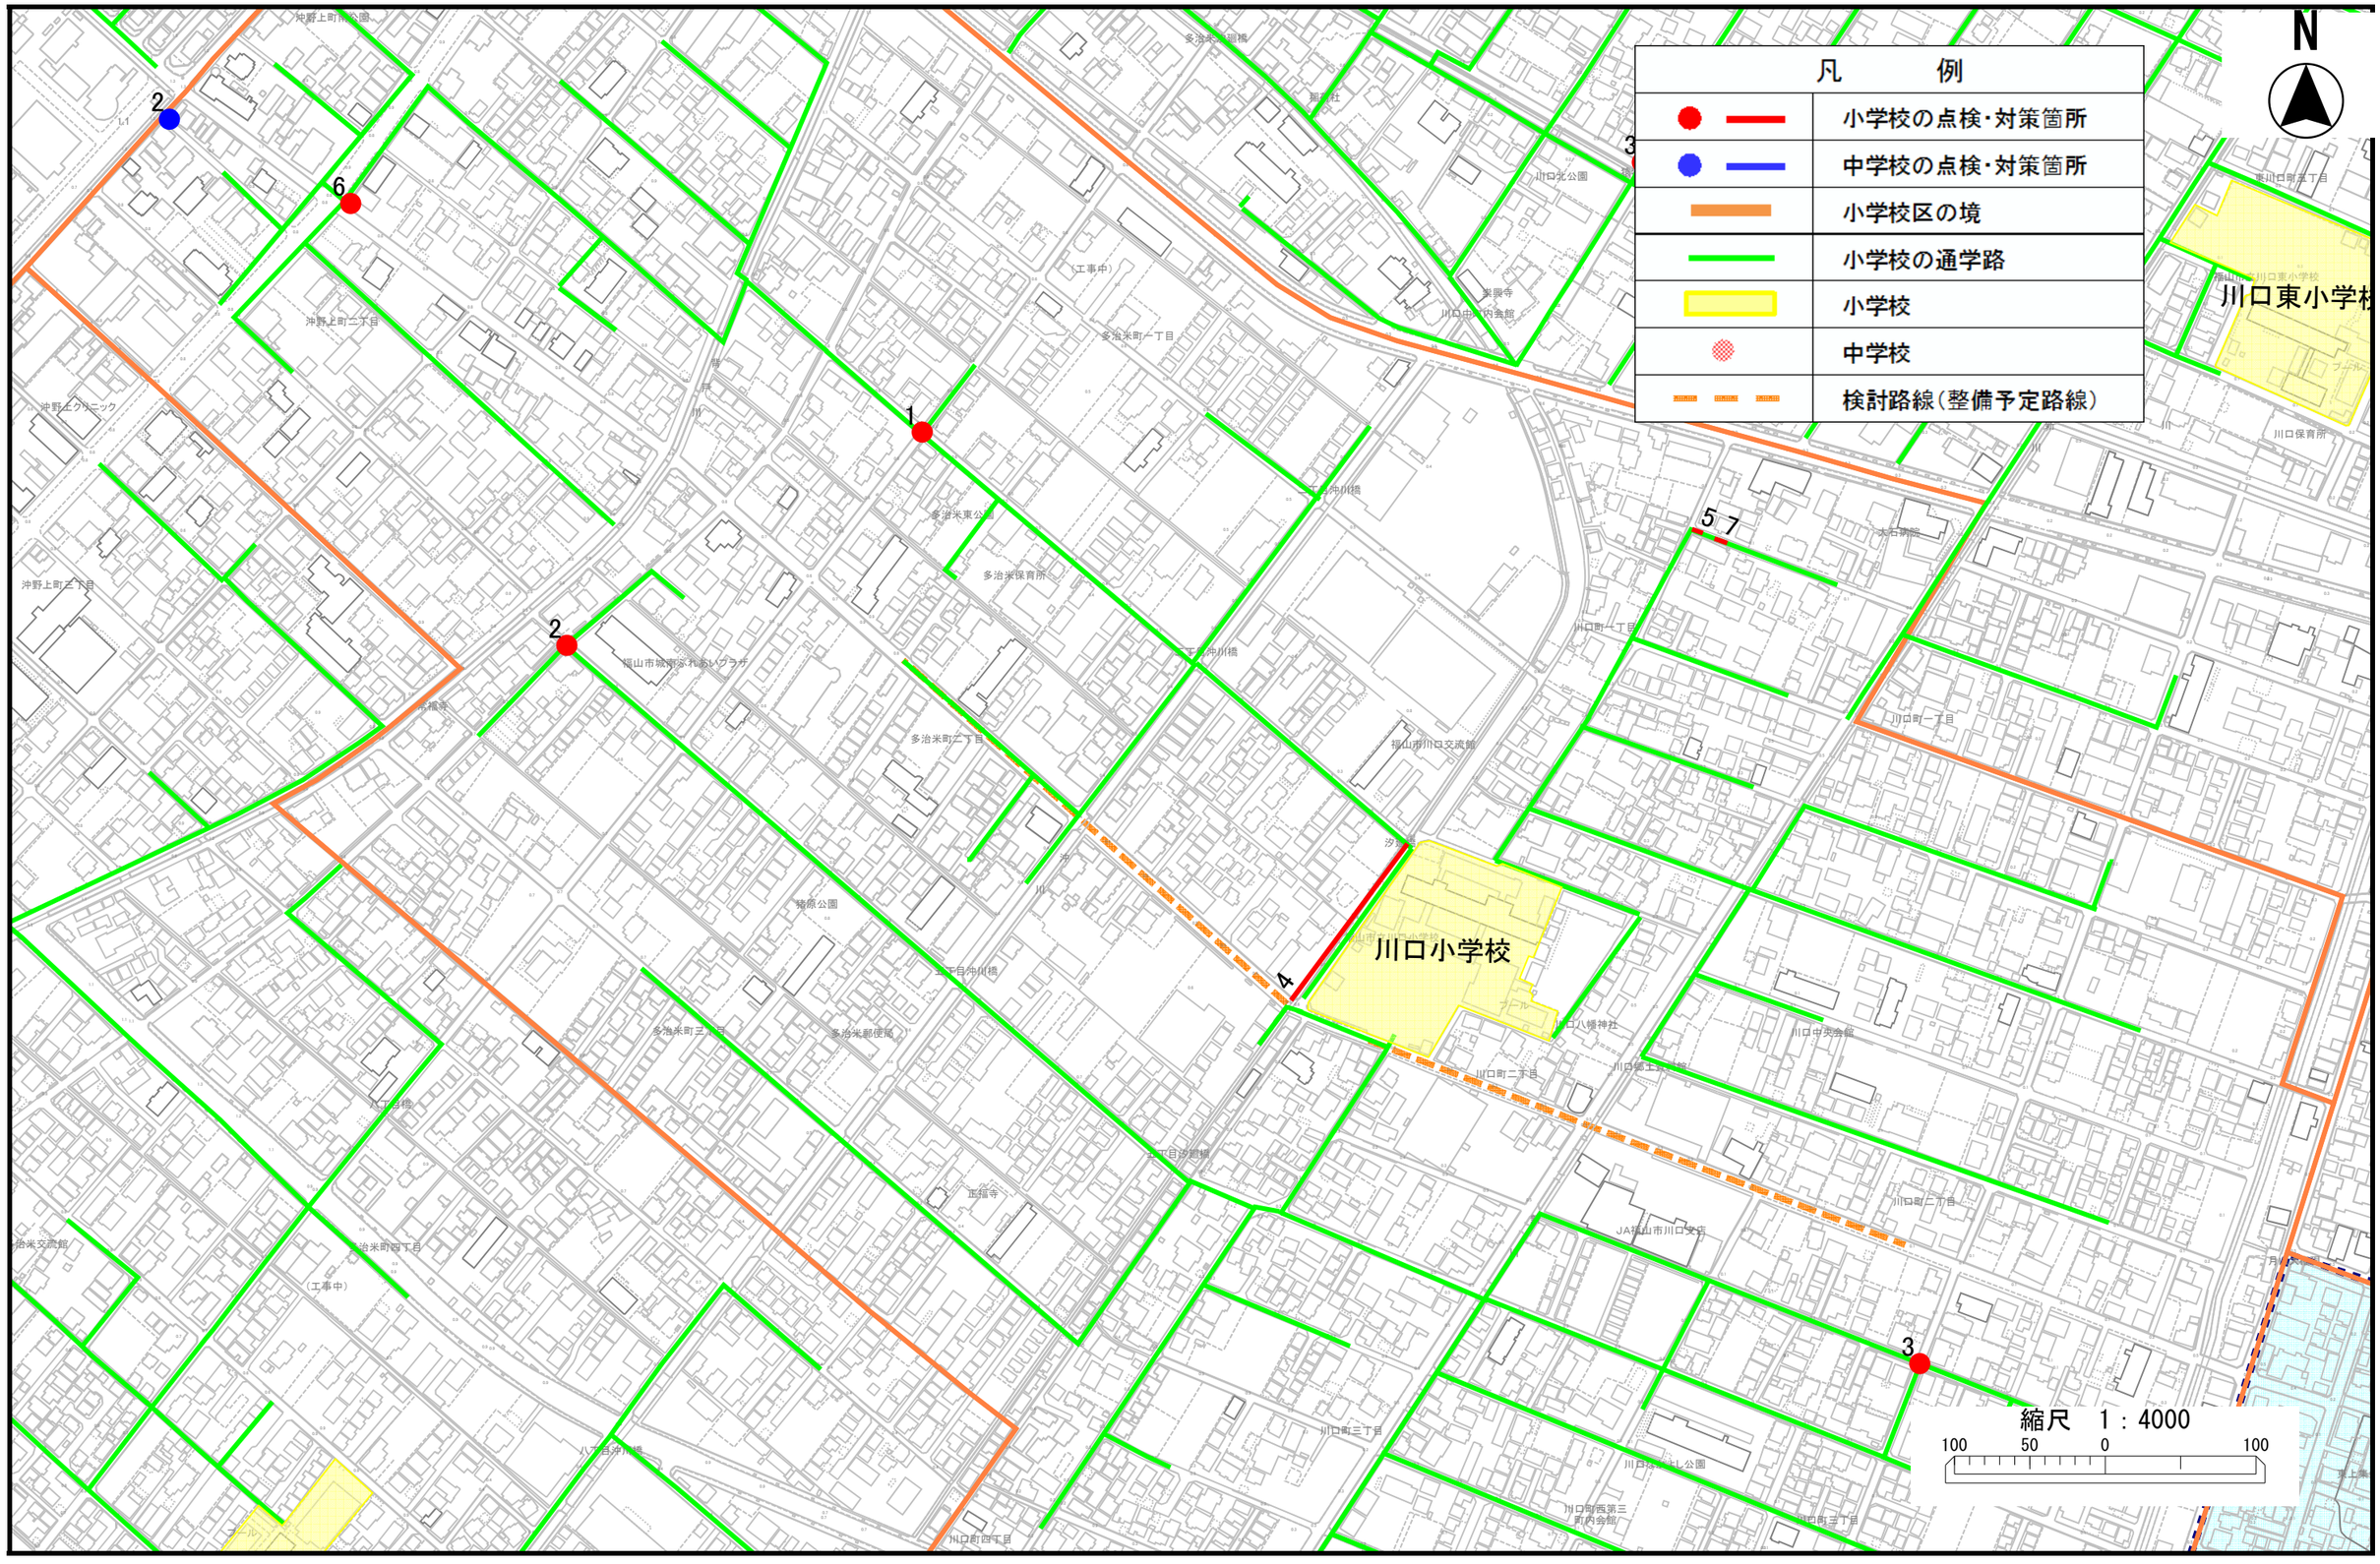
凡　　例
小学校の点検・対策箇所
中学校の点検・対策箇所
小学校区の境
小学校の通学路
小学校
中学校
検討路線（整備予定路線）
N
川口小学校
川口東小学校
縮尺　1：4000
100　50　0　100
1
2
2
3
4
5
6
7

学校名	位置図番号	通学路点検年度	危険内容	通学路対策予定内容/できない理由	対策状況ステータス	備考
川口	1	2024	横断の際の見通しが悪く、危険である。また、南北の道が通勤路として利用されており交通量が多いが、東西の道に一時停止線が引かれているため、減速しないまま通行する車両がみられる。	【警察】 規制標示（一時停止）の修復 速度規制標示の設置 【市】 路面標示の設置（児童注意）	全て対応完了	
川口	2	2024	児童の飛び出しがあった。	【学校・地域】 児童生徒への交通安全教育	対策内容決定	
川口	3	2024	通学時に事故発生。車側からは民家の塀があり、見通しが悪い。	【市】 交差点マーク設置	全て対応完了	
川口	4	2022	転落防止柵の高さが低く（実測値800mm）、児童が転落する可能性がある。	【市】 転落防止柵の更新	対策内容決定	2022年度(令和4年度)からの継続[点検箇所番号4] 転落防止柵の更新 （80cm ⇒ 110cm）
川口	5	2020	側道に鉄板が敷いてあるが、児童がつまづいてケガをする恐れがある。 深い側溝があり、危険である。鉄板がかけてあるが、（住宅の完成状況により）側溝への転落防止対策が必要である。	【市】 転落防止柵の設置（地域の了承を得た後）	全て対応完了	2020年度(令和2年度)からの継続[2022点検箇所番号7] 居住者との協議が必要

学校名	位置図番号	通学路点検年度	危険内容	通学路対策予定内容/できない理由	対策状況ステータス	備考
川口	6	2018	交通量が多く、車のスピードも出ている。	【市】 外側線の引き直し	対応中	2018年度(平成30年度)からの継続[2022点検箇所番号８]
川口	7	2022	水路に転落防止柵が設置されていない。	【市】 転落防止柵の新設	全て対応完了	2022年度(令和4年度)からの継続[点検箇所番号6]
