蔵王小学校

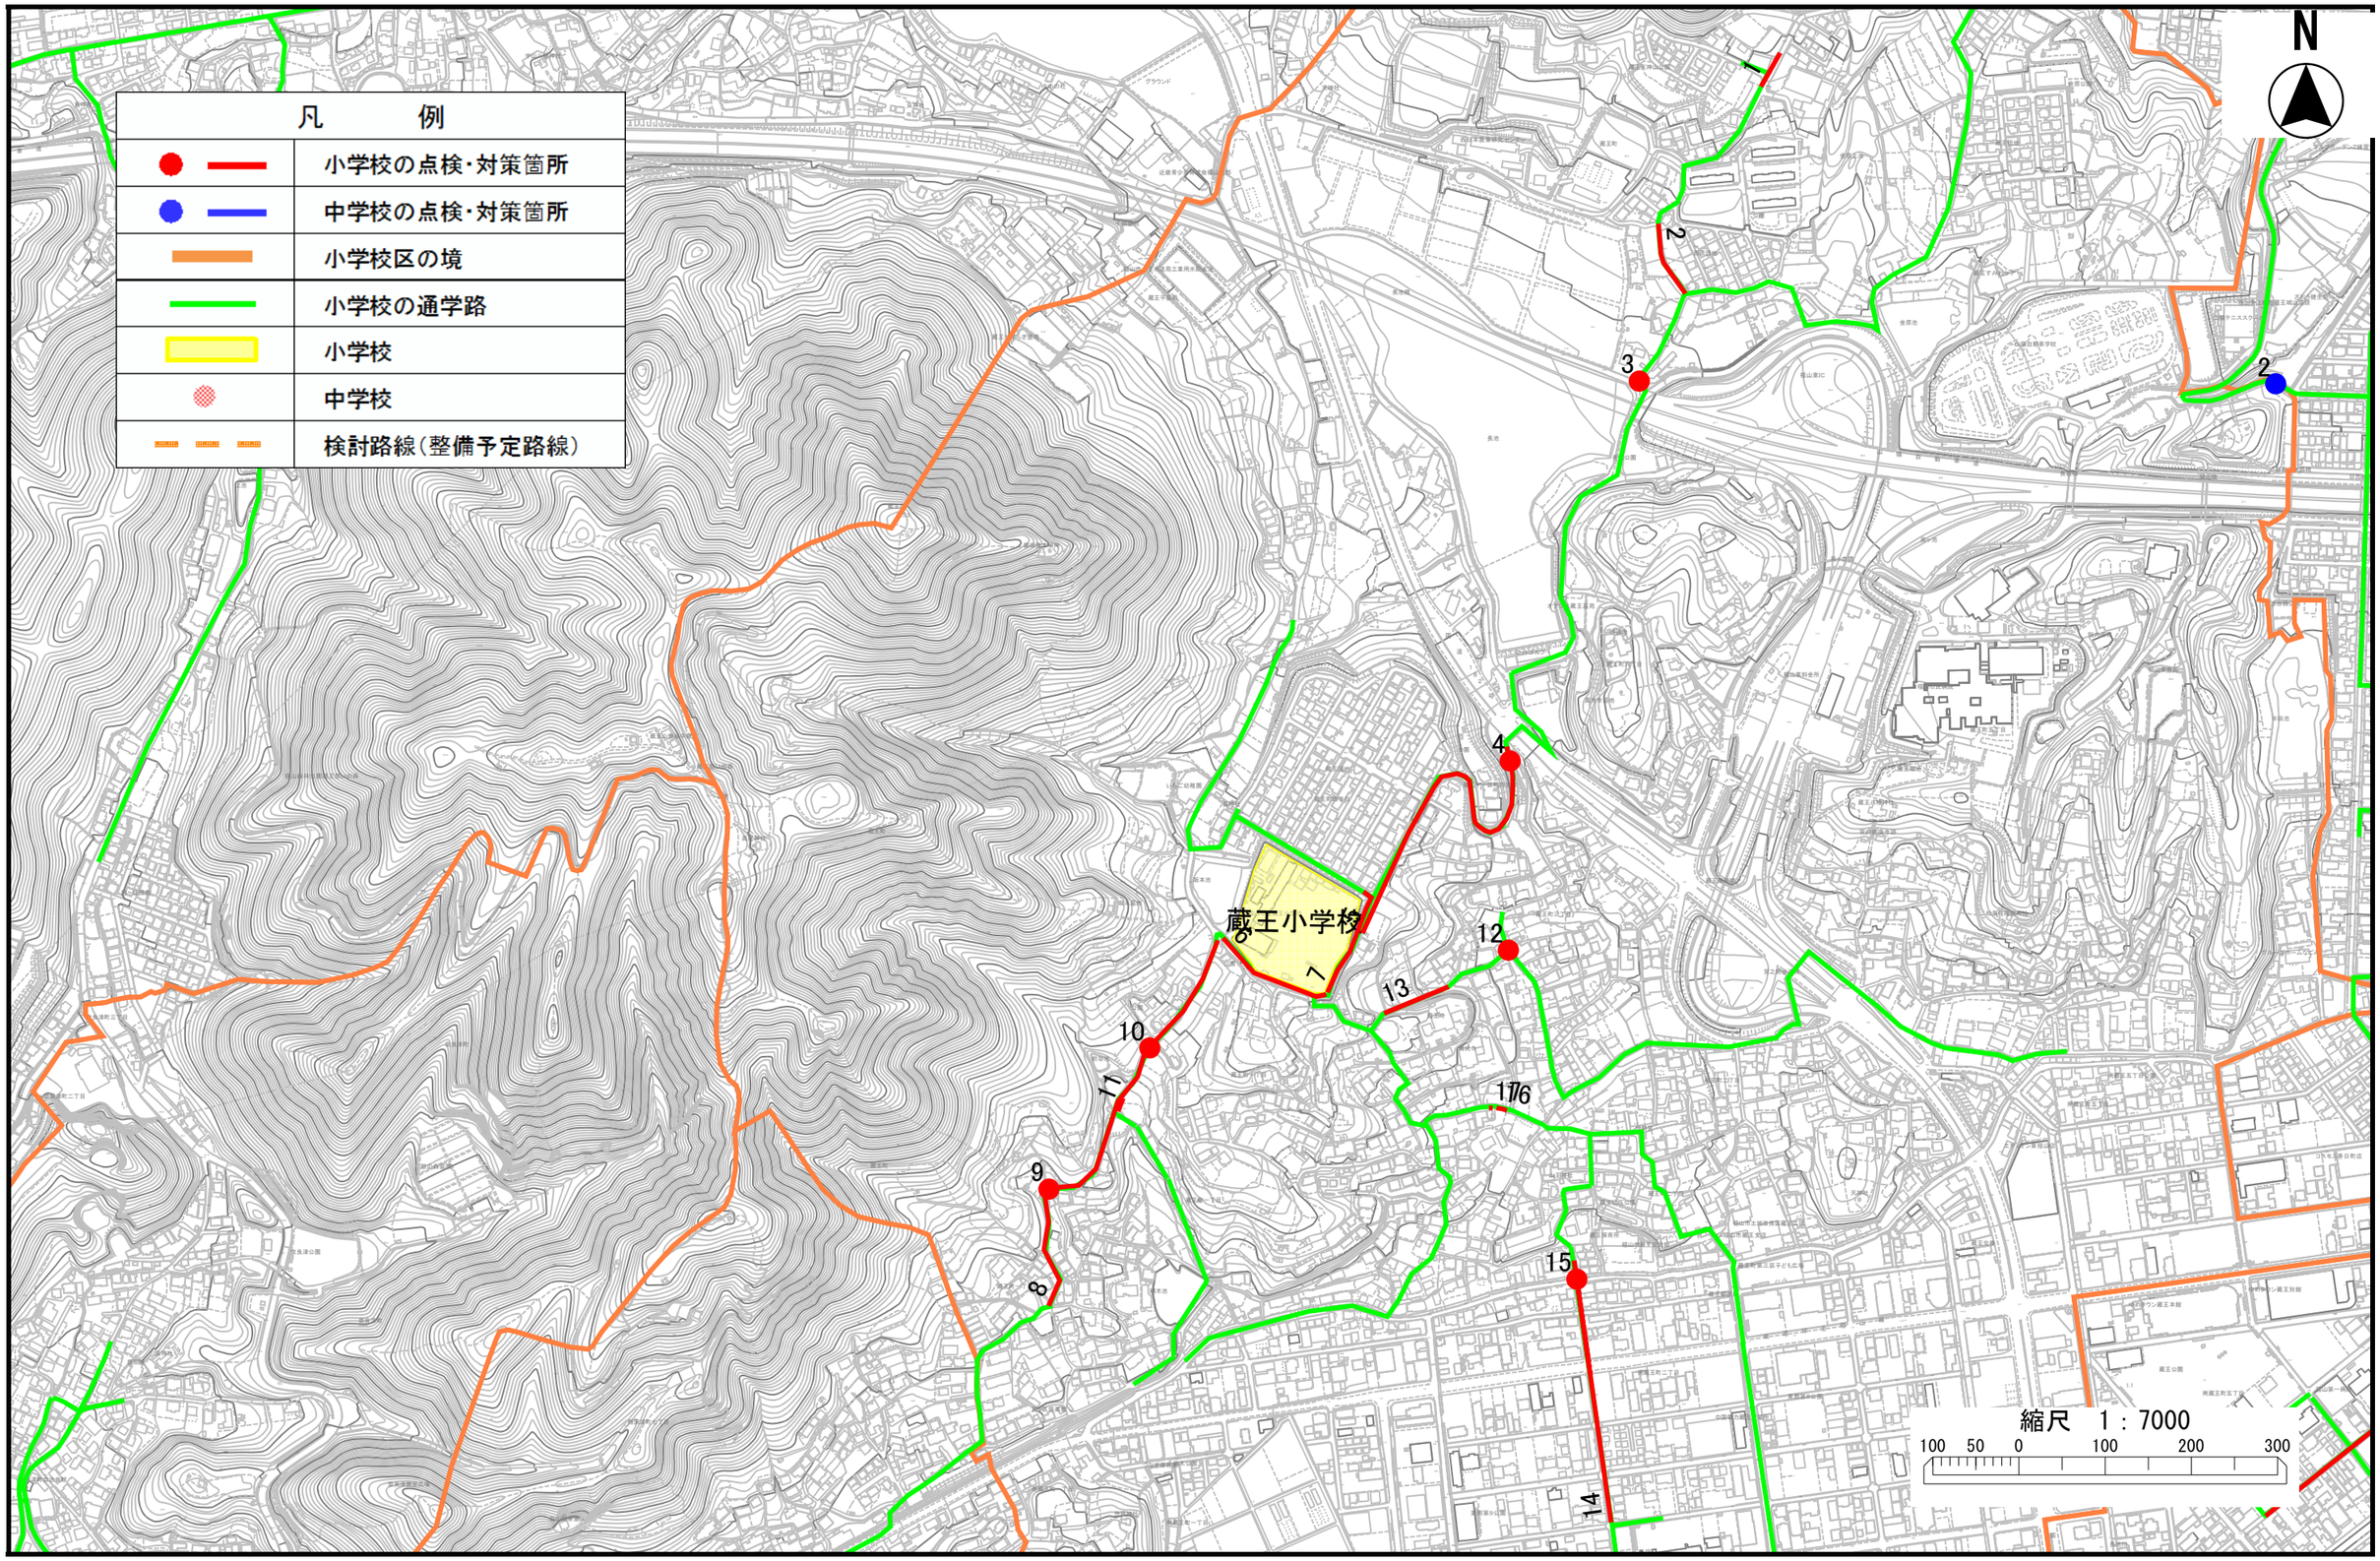
凡　例
小学校の点検・対策箇所
中学校の点検・対策箇所
小学校区の境
小学校の通学路
小学校
中学校
検討路線（整備予定路線）
N
蔵王小学校
縮尺　1：7000
100 50 0 100 200 300

学校名	位置図番号	通学路点検年度	危険内容	通学路対策予定内容/できない理由	対策状況ステータス	備考
蔵王	1	2024	登下校時、児童が誤って転落する危険がある。	【市】 転落防止柵の設置	全て対応完了	
蔵王	2	2024	ノンストップで上がる車がいて危険。	【市】 路面標示の設置（減速）	全て対応完了	
蔵王	3	2024	抜け道として通行する車が多い。子どもが横断歩道にいても止まらず進む車があり、危険。	【学校・地域】 横断旗の設置	全て対応完了	
蔵王	4	2024	一旦停止線が消え掛かっており、通学児童が事故に巻き込まれる懸念がある。	【市】 外側線の修復及びドット線の新設	全て対応完了	
蔵王	5	2024	児童が登校している時間帯は、通勤時間とも合致している。通勤帯時の急いでいる車に通学児童が巻き込まれる危険がある。	【市】 路側帯カラー化（グリーンベルト）	全て対応完了	
蔵王	6	2024	児童が登校している時間帯は、通勤時間とも合致している。通勤帯時の急いでいる車に通学児童が巻き込まれる危険がある。	【市】 路側帯カラー化（グリーンベルト）	全て対応完了	

学校名	位置図番号	通学路点検年度	危険内容	通学路対策予定内容/できない理由	対策状況ステータス	備考
蔵王	7	2024	児童が登校している時間帯は、通勤時間とも合致している。通勤帯時の急いでいる車に通学児童が巻き込まれる危険がある。	【市】 路側帯カラー化（グリーンベルト）	全て対応完了	
蔵王	8	2024	道路が狭く、また、交通量が多い。	【市】 外側線の新設	全て対応完了	
蔵王	9	2024	カーブミラーはあるが見えにくい。	【市】 道路反射鏡角度調整	全て対応完了	
蔵王	10	2024	道路が狭く、また、交通量が多い。見通しが悪い。	【市】 道路反射鏡の設置検討	全て対応完了	
蔵王	11	2024	児童が誤って転落する危険がある。	【市】 転落防止柵の設置	全て対応完了	
蔵王	12	2024	道路は狭いが、182号線からの抜け道として児童の登校時にかなりのスピードで車が通る。事故の危険がある。	【市】 交差点マーク設置	全て対応完了	

学校名	位置図番号	通学路点検年度	危険内容	通学路対策予定内容/できない理由	対策状況ステータス	備考
蔵王	13	2024	児童が誤って転落する危険がある。	【市】 転落防止柵の設置	全て対応完了	
蔵王	14	2024	道幅が狭いが交通量が多く、児童は、車が通ると止まって端に寄っている。	【市】 外側線の新設	全て対応完了	
蔵王	15	2024	道幅が狭いにもかかわらず、車の通行量が多いところを児童が横断し、事故にあう危険がある。児童の登校時間帯と車の通勤時間帯が合致している。	【警察】 速度規制標示の設置	全て対応完了	
蔵王	16	2024	児童が誤って転落する危険がある。	【市】 転落防止柵の設置	全て対応完了	
蔵王	17	2024	児童が誤って転落する危険がある。	【市】 転落防止柵の設置	全て対応完了	
